

CERAMICA CANELLA LTDA

ROD ITAPIRA/JACUTINGA, S/N KM
166,5 - MACUMBE - CEP:13972-012
- Itapira - SP
TEL: - FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL, ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000021690 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3512 0148 6206 9400 0196 5500 1000 0216 9019 5983 0565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220013779921 05/01/2022 08:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374012255114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

48.620.694/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC	CNPJ / CPF 49.917.156/0001-20	DATA DA EMISSÃO 05/01/2022
ENDEREÇO Rua Allan Kardec, 159	Bairro / Distrito Jardim Isaura	CEP 13972-186
MUNICÍPIO Itapira	UF SP	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VEND	VALOR	Nº DUPLICATA	VEND	VALOR	Nº DUPLICATA	VEND	VALOR
001	05/01/2022	391,50						

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS-SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
391,50	52,07	0,00	0,00	391,50
VALOR DO PIS/PF	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	391,50

TRANSPORTADOR / VOLENTES TRANSPORTADOS

NAME / RAZÃO SOCIAL CERAMICA CANELLA LTDA	PRETE POR CONTA	CONDICAO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 48.620.694/0001-96
ENDEREÇO ROD ITAPIRA/JACUTINGA, S/N	MUNICÍPIO	Itapira		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 374012255114
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 880,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ITEM DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / IB	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMs / IR
113010	CANALETA U - 19 X 19 X 29	68041000	000	5101	PC	150,00	2,61	391,50	0,00	391,50	52,07	0,00	13,30 0,00

Ped. Cláusula 16080 Itam

PROCESSO
Nº 2842710/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO Rua Prof. Fenizio Marchini, 1030 - Flávio Zachi - CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP. TEL: (19)3863-5066 financeiro@depositomarchioretto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001075 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
			CHAVE DE ACESSO 3522 0130 9458 1300 0115 5500 1000 0010 7510 0014 3159
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/painel ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220074607391 18/01/2022 10:15:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374093895110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 30.945.813/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		CEP/CNPJ 49.917.156/0001-20	DATA DA EMISSÃO 18/01/2022
ENDERECO RUA ALLAN KARDEC, 159		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ISaura	CEP 13972-186
MUNICÍPIO ITAPIRA		FONE / FAX (19)3863-1577	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:15:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA Nº - RAZÃO SOCIAL		CEP/CNPJ 49.917.156/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO RUA ALLAN KARDEC, 159		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ISaura	CEP 13972-186
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP	TELEFONE / FAX

CÁLCULO DO IMPPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.862,48	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESL.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 6.584,71	
0,00	0,00	277,77		0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PAGUE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL: O MESMO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 29	VOLUME VOLUMES	MARCA	REMESSA	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERV.	NCM / CBO	CBX04	CP04	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IEL	ALIQUOTAS ICMS / IPI
12	PEDRA 1	25171000	0102	5102	MT	2,0000	110,40	8,84	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25223510	0500	5405	BC	10,0000	26,49	10,72	254,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
362	TRELICA H-12 (GDC)	73084000	0102	5102	MT	24,0000	10,01	9,72	230,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,20
17	AREIA MÉDIA (VIGEM)	26059000	0102	5102	VG	1,0000	429,60	17,40	412,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5	CAL ITAU	25221000	0500	5406	BC	10,0000	16,89	6,07	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
10081	CIMENTO 50KG TUPI CP II-E-32	25223510	0500	5406	BC	10,0000	27,09	11,33	266,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
362	TRELICA H-12 (GDC)	73084000	0102	5102	MT	8,0000	10,01	2,43	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25223510	0500	5406	BC	10,0000	26,49	10,72	254,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5	CAL ITAU	25221000	0500	5406	BC	10,0000	14,89	5,07	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
298	FERRO 6,30MM 1M CABO 12MTS	72142000	0500	5406	BR	12,0000	33,58	10,30	360,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
12	PEDRA 1	25171000	0102	5102	MT	1,0000	110,40	4,47	105,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25223510	0500	5406	BC	10,0000	26,49	10,72	254,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
15362	VIGA 12,00M 12X14 40 5/16 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	2,0000	338,85	27,43	850,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
15362	VIGA 10,50M 12X14 40 5/16 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	3,0000	296,50	36,00	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
15362	VIGA 9,50M 12X14 40 5/16 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	2,0000	388,25	21,72	814,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 25699, 25703, 25711, 26112, 26937, 28426 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trâns Aprox R\$: 788, 44 Fed e 912, 58 Est Posto: IBPT 5e7eW Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 OBS. CLIENTE: Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019	RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO

Rua Prof. Fenizio Marchini, 1030 - Flávio Zachi -
CEP: 13971-000 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-5066
financeiro@depositumarchioretto.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELÉTRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001075 Fl. 2 /2
SÉRIE 001



DATA DE ACESSO

3522 0130 9458 1300 0115 5500 1006 0010 7510 0014 3159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

374093895110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE:

CNPJ / CPF:

30.945.813/0001-15

CONTINUACAO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CII	QNTD	CPFCPF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	MARGE CALC. %/SIS.	VALOR ICMF	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
15380	COLUNA 1,50M 10X17 40 3/8 EST 5MM CADA 15 - 70CM S/EST 1	73084000	0102	5102	PC	1,0000	54,80	2,22	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15380	COLUNA 2,00M 12X17 40 3/8 EST 5MM CADA 15	73084000	0102	5102	PC	1,0000	74,80	2,02	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15382	VIGA 8,30M 12X14 40 5/16 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	234,40	9,49	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	TRELIÇA H-B (CDC)	73084000	0102	5102	MT	48,0000	5,22	17,91	424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13780	SAPATA 480649X38	73084000	0102	5102	UN	1,0000	120,30	4,87	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17442	ESTACA 2,50M 018CM 40 3/8 EST 5MM CADA 20	73084000	0300	5406	UN	1,0000	87,16	3,53	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16364	ARRANQUE 038 COM 1,0CM	73084000	0102	5102	PC	4,0000	5,00	0,91	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16363	ESTRIBO 05MM - 20X20	72142000	0102	5102	PC	2,0000	2,08	0,21	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153...	COLUNA 3,50M 14X24 40 3/8 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	128,15	5,19	122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15390	COLUNA 3,80M 14X24 40 3/8 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	139,10	5,63	133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15383	ESTRIBO 06MM - 140X24	72142000	0102	5102	PC	12,0000	2,62	1,22	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15382	VIGA 4,30M 16X24 40 3/8 EST 5MM CADA 15 - 58CM S/EST 2	73084000	0102	5102	PC	1,0000	178,85	7,24	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15380	COLUNA 3,70M 20X20 40 3/8 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	197,95	5,57	192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	EMENTO 50KG LIZ CP-NV 32 R5	24023910	0500	5406	SC	10,0000	26,49	10,72	254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CONFERE COM
O ORIGINAL

BMJ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



BMJ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RUA TIRADENTES 48 LOJA CENTRO
CEP 0650-000 SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP
FONE:(19) 3672-0660
www.construcoesachametor@gmail.com

Documento Auxiliar
da Nota
Fiscal Eletrônica



0-+ ENTRADA
1- SAÍDA
N. 00059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3522 0144 7269 5800 0130 5500 1000 0000 5911 6364 9950
Consulta de autenticidade no portal eletrônico do NF-e
www.mefazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220103137961 24/01/2022 16:36:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Venda de merc adquirida ou receb de terc

INSCRIÇÃO FANTASMA: 611.002.821.111	CPF/PESSOA JURÍDICA: 00000.000.000-00	CNPJ:	44.726.958/0001-30
-------------------------------------	---------------------------------------	-------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME: RUA CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC ENDERECO: RUA ALLAN KARDEC 139		CEP: 09370-156	DATAS DA ENTRADA: 24/01/2022
MUNICIPIO: ITAPIRA	TELEFAX: (19) 3863-1577	UF: SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 24/01/2022

CALCULO DO IMPORTE:

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO PIS/MICROSISTEMA	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO PIS/FIPEX:	VALOR DO COFINS	VALOR IPI:	VALOR TOTAL DO PRODUTO:
0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00

ENCARGOS E TAXAS / VOLUME TRANSPORTADO:

BASE DE CALCULO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DE CORRIMENTO	VALOR TOTAL
		9-SEM PIS/FIPEX	0,00	7.125,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VOLUME	UNIDADE	TIPO	NOME DA UNIDADE	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO
6642	UNID.	DIVERSOS	UNID.	UNID.			

BASE DE CALCULO DO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	CUSTO	CFOP	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR UNIT	VALOR IPI	VALOR TOTAL
000000000000	TELHA ROMANA ROSSIN UN.100 %	UNID.1000	100,00	3410	1%	5,48	57,40	UNID.1000	100,00	100,00	100,00
000000000000	TELHA CUME/FITA ROSSIN UN.100 %	UNID.1000	100,00	3410	1%	5,48	57,40	UNID.1000	100,00	100,00	100,00
000000000000	PALETA %	UNID.1000	100,00	3402	1%	5,48	57,40	UNID.1000	100,00	100,00	100,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

SABER-ATRIBUÍDO:


INFORMACOES CONFIDENCIAIS:
VENDEDOR: VISKI - Valor Apeos. dos Tributos R\$ 1.907,13 (26,77%) - Lei 12.741 Ponte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR MEU OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA
DIREITO A CREDITOS DE IPI

INFORMACOES CONFIDENCIAIS:

PROTECAO DE DADOS: Fiscais, Notas fiscais, Documentos fiscais e outras informações contidas nesse documento. Data de emissão: 24/01/2022 - Valores em reais.

ENCIENDO DE QUE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETÔNICA FABRICADA NO LADO INVERSO SÃO OS SEGUINDES VALOR TOTAL: R\$ 7.125,00
DESTINATÁRIO: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC, RUA ALLAN KARDEC, 139, VILA IZaura, 09370-000, ITAPIRA-SP

Data: 24/01/2022 16:36:40

 CONFIRMO CONFERIR
CONFIRMO CONFERIR
CONFIRMO CONFERIR
CONFIRMO CONFERIR
CONFIRMO CONFERIR
CONFIRMO CONFERIR

NF-e
N. 00059
SÉRIE 1

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO –
PROCESSO Nº 2842710/2019**

Período de 01 a 31/01/2022

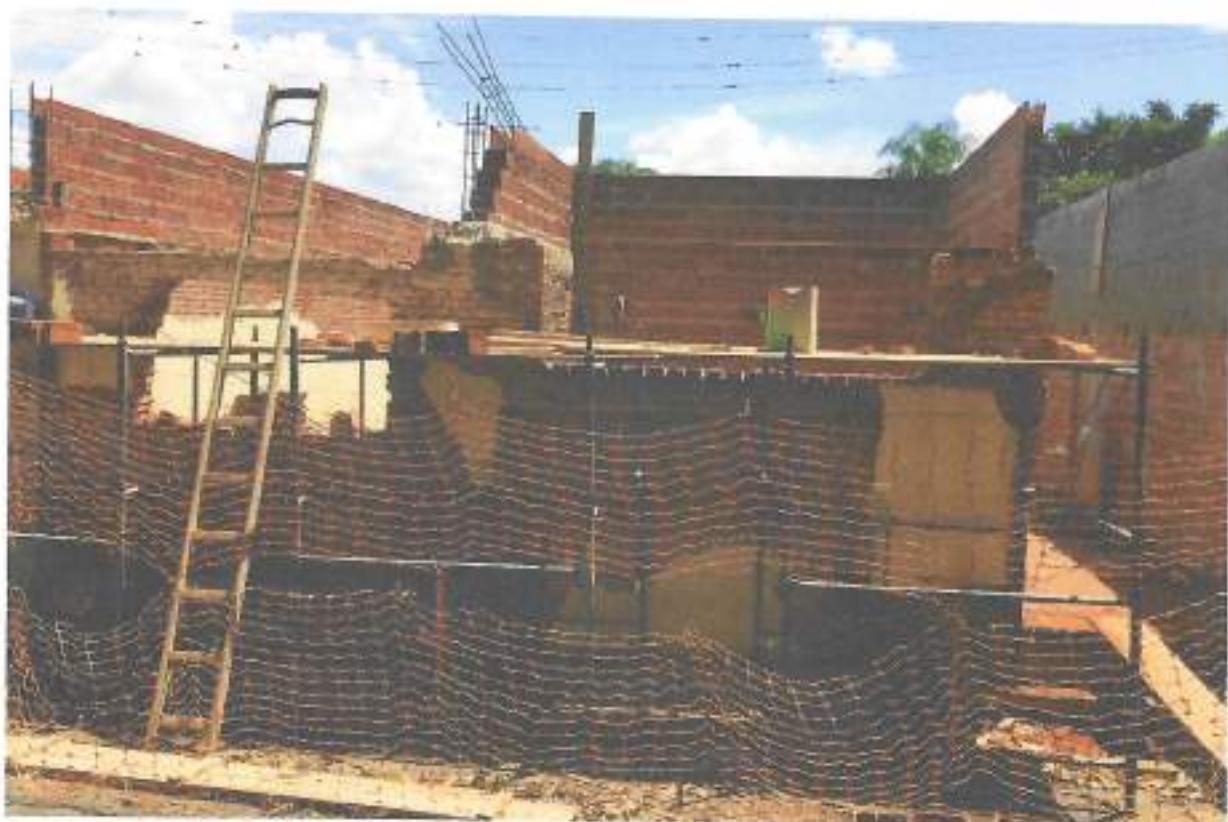


Foto 01 – Armação de pilar e concretagem – data: 04/01/2022



Foto 02 – Armação de pilar, concretagem e canaletas – data: 06/01/2022



Foto 03 – Alvenaria de vedação, verga e contraverga – data: 10/01/2022



Foto 04 – Alvenaria de vedação, verga e contraverga – data: 10/01/2022



Foto 05 – Armação e concretagem de viga – data: 11/01/2022



Foto 06 – Chapisco e concretagem do contrapiso – data: 17/01/2022



Foto 07 – Desmontagem caixaria e alvenaria de contraverga – data: 17/01/2022

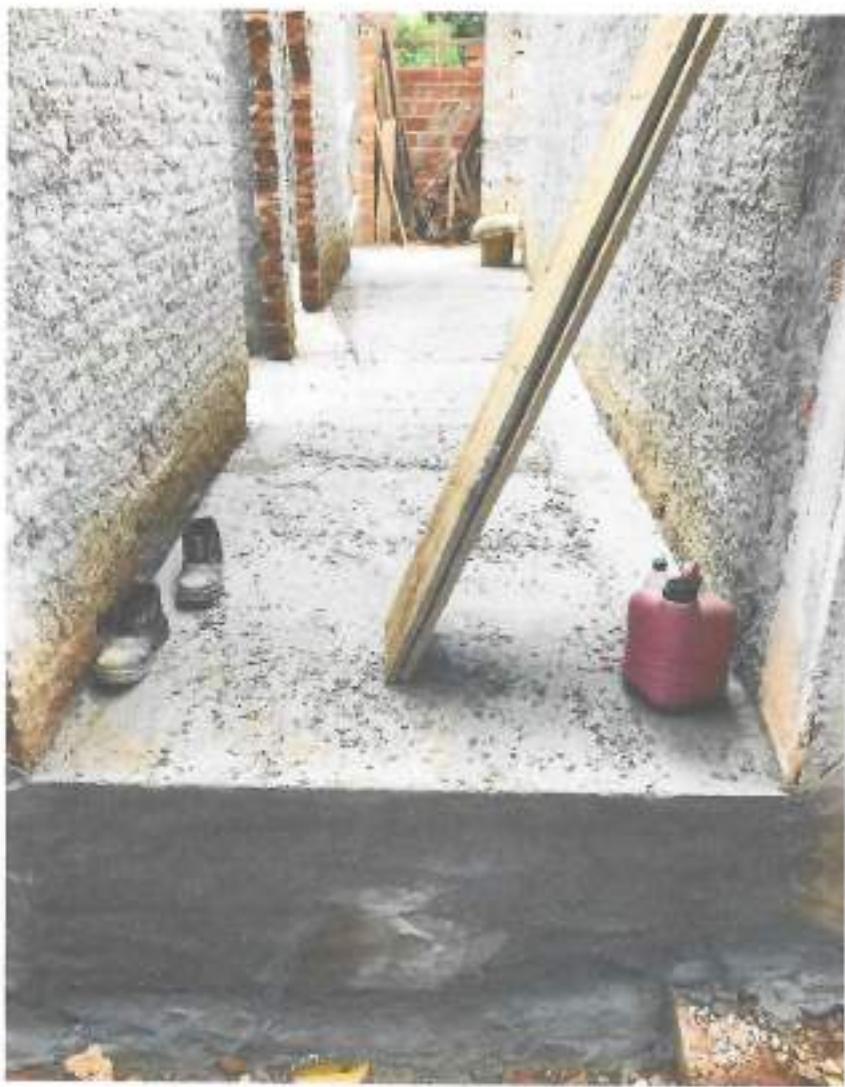


Foto 08 – Chapisco e concretagem do contrapiso – data: 18/01/2022



Foto 09 – Impermeabilização de alicerce da parede – data: 19/01/2022



Foto 10 – Piso cimentado – data: 20/01/2022

✓ ✓



Foto 11 – Piso cimentado – data: 20/01/2022

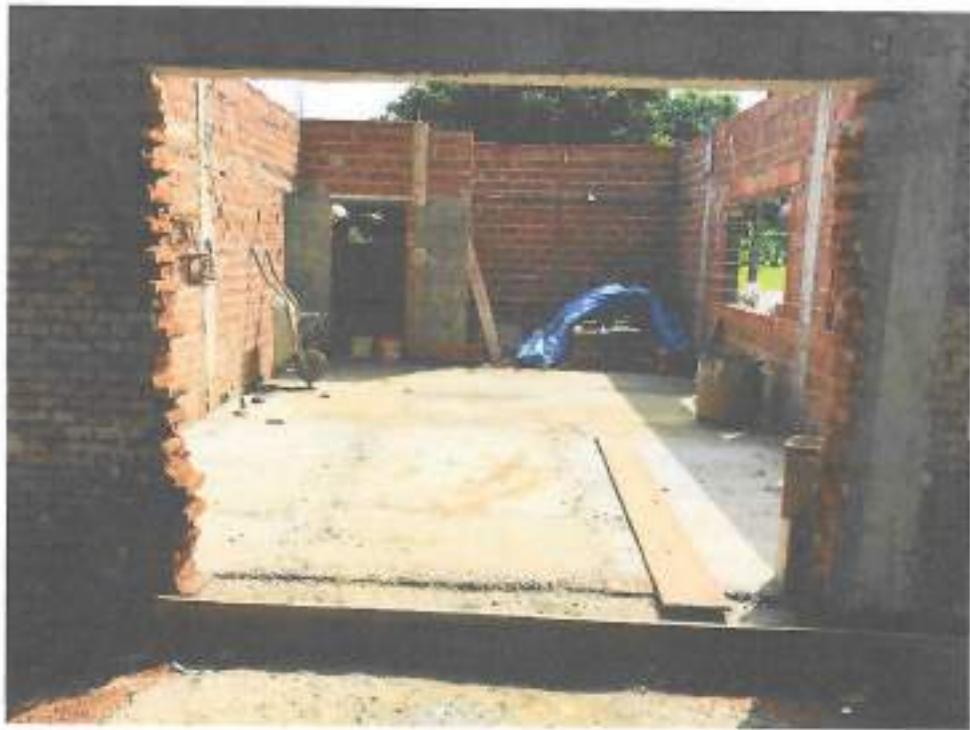


Foto 12 - Piso cimentado – data: 21/01/2022



Foto 13 – Alvenaria baldrame de pilar – data: 24/01/2022



Foto 14 – Alvenaria baldrame de pilar – data: 24/01/2022



Foto 15 – Aterro do piso para cimentar – data: 25/01/2022



Foto 16 – Aterro do piso para cimentar – data: 25/01/2022

f b.



Foto 17 – Piso cimentado – data: 26/01/2022



Foto 18 – Alvenaria baldrame e canaletas – data: 26/01/2022

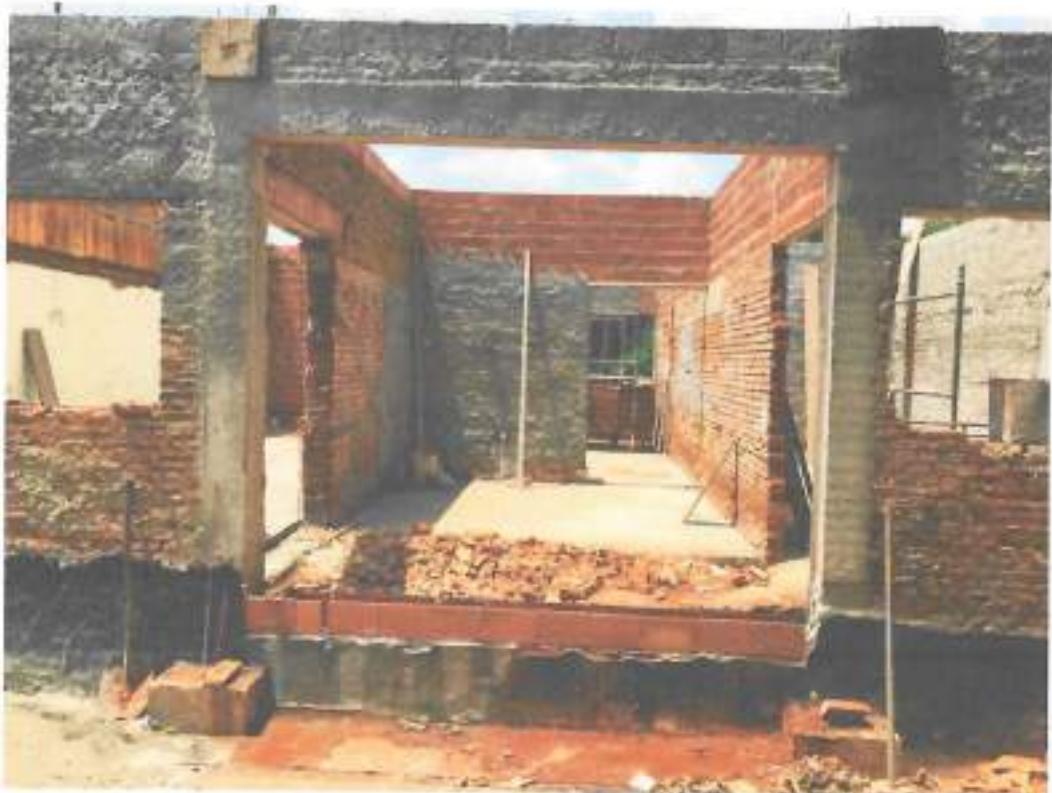


Foto 19 – Alvenaria baldrame e canaletas – data: 27/01/2022



Foto 20 – Alvenaria de vedação e chapisco – data: 31/01/2022

 Tiago Félix
Arquiteto

 Belarmino Peres Júnior
Presidente



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JAN/22	
							Subtotal	R\$ 6.924,96
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	60%	2.821,54
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
ITEM	CÓD. REF. 98600	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	REALIZADO	
							Subtotal	R\$ 49.367,17
2 INFRA ESTRUTURA								
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÓRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIOLHO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TIRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÂO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	300983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBAS DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	90%	3.914,72
2.15	99059	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL, DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91



ITEM	COD. REF. PROJETO	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA, AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	100%	9.798,91
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAVENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICÁ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	m³	5,80	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	100%	2.847,04
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	95%	1.962,31
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	95%	1.541,81
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	33%	13.636,18
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m³	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	85%	3.424,92
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	75%	4.359,99
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	75%	1.165,15
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	75%	2.118,88
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 m² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	75%	676,67
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 m² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	50%	461,38
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020	m²	236,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	5%	1.429,20
4		PAREDES E PAINÉIS			Subtotal	R\$ 35.960,49	79%	28.550,59
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6m² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	80%	507,06
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	80%	16.810,18



ITEM	CÓD. REF. PROJETO	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	23,07	R\$ 179,41	R\$ 4.000,57		
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58		
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,66		
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61		
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59		
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60		
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36		
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,02	10%	7.500,44
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93		
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBRAS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAKE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69		
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAKE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66		
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07		
5.5	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32		
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36		
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65		
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	8,30	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43		
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOULHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41		
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60		

Fonte: www.mctes.gov.br | Última atualização: 2023-09-26 | Versão: 2023-09-26

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.F.N.J. 45.917.156/0001-36
RUA ALLAN KARDEC, 450 - FONTE DA VIDA, 2557 - 3662-4877 - CEP 12972-100 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	CÓD. REF. PRECO	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66		
6.5	91805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17		
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78		
6.7	300702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALTAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59		
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.904,20	2%	245,70
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	0%	0,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	15%	245,70
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00		
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00		
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50		
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00		
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50		
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80		
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94		
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,96	R\$ 54,72		
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60		
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un.	41,00	R\$ 9,92	R\$ 405,72		
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08		
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00		
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00		
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44		
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66		

ITEM	CÓD. REF. PRECO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20		
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16		
7.20	97582	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88		
II			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.371,03	2% 350,88
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	0%	0,00
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	0%	0,00
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	0%	0,00
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	0%	0,00
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	0%	0,00
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	0%	0,00
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	0%	0,00
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	0%	0,00
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	0%	0,00
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	0%	0,00
8.11	89396	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	0%	0,00
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	0%	0,00
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	0%	0,00
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	0%	0,00
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	0%	0,00
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	0%	0,00
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	0%	0,00

ITEM	COD. REF- PRECO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	0%	0,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	0%	0,00
8.20	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	0%	0,00
8.21	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	0%	0,00
8.22	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	5%	275,60
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	0%	0,00
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	0%	0,00
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	0%	0,00
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	20%	36,78
8.27	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	20%	38,50
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	0%	0,00
8.29	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	0%	0,00
8.30	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICais DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	0%	0,00
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	0%	0,00
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50X1,1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	0%	0,00
9		PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO			Subtotal	R\$ 537,96		
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46		
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO5 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46		
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04		
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22		

ITEM	CD/CRF- ERCO	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83		
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59		
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	2,00	R\$ 185,89	R\$ 371,78		
10.4	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00		
10.5	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02		
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76		
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m ²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38		
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27		
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59		
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53		
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00	3%	522,00
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 3:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00	20%	477,00
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAÑOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00		
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59		
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63		
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19		
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00		
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m ²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00		
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37		

Foto: www.casa-de-reposo-allan-kardec.com.br



ITEM	COD. REF. PRECO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMENTADA] ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19		
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64		
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71		
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86		
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64	20%	3.817,95
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89		
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75		
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 3.824,74		
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62		
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94		
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADE FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18		
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17		
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANOS ÚMIDOS. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10		
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANOS ÚMIDOS AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07		
						TOTAL R\$ 350.382,91		

Autor do Projeto/Respon
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente da entidade



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL
DADOS DO CONVÉNIO OU PARCERIA

Data:	31/01/2022	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISaura
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de	24/06/2021	Término da vigência: 24/06/2022
Valor do convênio:	R\$ 200.000,00	Valor total da obra: R\$ 350.382,91
		Valor da contrapartida: R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?	Sim <input checked="" type="checkbox"/> →	Valor total da obra licitada: R\$ 350.382,91
		Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 24/06/2022
		% de execução física da obra: 30,93% % de execução financeira da obra: 30,93%
Não <input type="checkbox"/> →	Em Licitação? Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Período: _____	
<input type="checkbox"/> →	Paralisada? Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Período: _____	
Data prevista inauguração:	JULHO/2022	
Eng.Arq responsável pela obra:	TIAGO FELIX	
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail: CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX
CREA/CAU:	A26816-0 Assinatura:
ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)	

E-mail: casareposoallankardec@gmail.com

Site: www.casareposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.H.J. 48.017.15.0000-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-100 - ITAPIRA - SP



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 1.138,61

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
15/02/2022	NF 3541	OBRAS-MATERIAL	R\$ 1.680,00
17/02/2022	NF 1117	OBRAS-MATERIAL	R\$ 4.880,00
17/02/2022	NF 2012	OBRAS-PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 211,75
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	R\$ 8,25
17/02/2022	NF 2013	OBRAS-PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 211,75
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	R\$ 8,25
17/02/2022	NF 250	OBRAS-MATERIAL	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 13.000,00

Número de Documentos Relacionados: 07

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 13.000,00

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 153.026,56

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 28 de fevereiro de 2022.
Belarmino Peres Junior
Presidente



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO N°: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE			
HISTÓRICO		PAGAMENTO				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2021		ORDEM BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP MAT.CONST.MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.564,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG.CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 866	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 187.365,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,80	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120801	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
05/01/2022	NF 21690	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 391,50	R\$ -	R\$ 177.378,35
11/01/2022		RECURSO PRÓPRIO	192385753	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ 177.405,64
18/01/2022	NF 1075	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	11801	R\$ 6.584,71	R\$ -	R\$ 170.820,93
18/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 178,23	R\$ 170.999,16
18/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 26,26	R\$ 171.025,42
25/01/2022	NF 59	BMJ MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12501	R\$ 7.125,00	R\$ -	R\$ 163.900,42
25/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 191,94	R\$ 164.092,36
25/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 164.132,40
31/01/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 755,55	R\$ 164.887,95
15/02/2022	NF 3541	CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP	550171000013710	R\$ 1.660,00	R\$ -	R\$ 163.207,95
15/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 163.259,70
15/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 163.265,91
17/02/2022	NF 1117	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	21701	R\$ 4.880,00	R\$ -	R\$ 158.385,91
17/02/2022	NF 2012	LUPPI & PEDROSO LTDA	21702	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 158.174,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21703	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 158.165,91
17/02/2022	NF 2013	LUPPI & PEDROSO LTDA	21704	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 157.954,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21705	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 157.945,91
17/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 172,50	R\$ 158.118,41
17/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 24,60	R\$ 158.143,01
24/02/2022	NF 250	RODRIGUES E RODR.CONST REF.LTDA	22401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 152.143,01
24/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 207,00	R\$ 152.350,01
24/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 41,28	R\$ 152.381,29
28/02/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 635,27	R\$ 153.026,56
		SALDO FINAL				R\$ 153.026,56

Itapira, 28 de fevereiro de 2022.

Belarmino Peres Júnior
Presidente

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC CNPJ / CPF: 48.817.156/0001-25													
 <p>Cerâmica Hollywood Ltda EPP</p> <p>Rod. SP 352 KM 186,5, S/N - Macumby ITAPIRA - SP CEP: 13672-319 Telefone/Fax: (19) 3863-2431</p>		DANFE Documento Aquecida da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.541 Série 001 Página 1 de 1		 Chave de Acesso 3522 0257 8227 2200 0103 5500 1000 0035 4110 0286 1808 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
Notas de Observação: VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO				Prazo de Automação de Lio: 135220207973223 15/02/2022 09:22										
Endereço Estadual: 374022029111	Endereço Estadual do Subst. Iva:			(SP) 57.622.722/0001-03										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
Nome / Razão Social: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC				CPF / CNPJ / ID ESTRANGEIRO 49.917.156/0001-20										
Endereço: R ALLAN KARDEC, 159 -		Bairro: VILA IZaura	CEP: 13972-186	Data de Emissão / Série										
Município: ITAPIRA	Telefone / Fax:	UF- SP	Unidade Fiscal:	Unidade Municipal										
FATURA		DUPLICATAS												
Regime Fisco: 0 - A Vista 1 - A Prazo	Número: 0	Valor Original: Valor Desconto: Valor Liquido:	NÚMERO VALOR VALOR	NÚMERO VALOR VALOR										
CÁLCULO DO IMPPOSTO														
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Aproximado da Imposta	Valor Total das Produtua									
0,00	0,00	0,00	0,00	449,40	1.680,00									
Valor do IPI	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Adicionais	Valor do IPI	Valor Total da Nota									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
Razão Social	Frete por Conta:	Colégio ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ									
Entrega:	1- FOB		Matrícula:	UF	Fabricante/Coleção:									
Quantidade	Unidade	Tabela	Numeração	Fuso Bruto	Fuso Líquido									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CDP Produtos / Serviços	Descrição dos Produtos / Serviços	ICMS / IPI	CFOP	CHAP	ENQ	UNI	VALOR	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR UNI
LAJOTA HOT	LAJOTA HOTX200x30 cm	69049000	0102	6101	PC		2.100,00	0,00	1.680,00					

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CÁLCULO DO ISSQN			
Município Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Informações Complementares: I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco:		Reservado ao Fisco	

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO Rua Prof. Fenízio Marchini, 1000 - Flávio Zachi - CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-5066 flamociro@depositomarchioreno.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001117 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0230 9458 1300 0115 5506 1000 0011 1710 0014 7150 Consulta de autenticidade ao portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220219585420 17/02/2022 08:15:51										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 37409389510		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIR:		CNPJ/CNP 30.945.813/0001-15										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		ENDERECO / DISTRITO RUA ALLAN KARDEC, 159		CNPJ/CNP 49.917.156/0001-20 DATA DA EMISSÃO 17/02/2022										
MUNICÍPIO ITAPIRA		FONE / FAX (19)3863-1577		UF SP										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME / RAZÃO SOCIAL RUA ALLAN KARDEC, 159		ENDERECO / DISTRITO JARDIM ISaura		CNPJ/CNP 49.917.156/0001-20 DATA DA EMISSÃO 17/02/2022										
MUNICÍPIO ITAPIRA				UF SP										
VALORES PAGOS														
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO BEM SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 4.880,00				4.956,59										
CÁLCULO DO IMPPOSTO														
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		4.956,59										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA 4.880,00										
0,00		0,00		76,59										
TRANSPORTADOR / VOLUME'S TRANSPORTADOS														
RAGÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR QNTDA 0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CNP										
ENDERECO 20 VOLUMES		NUMERO NÚMERO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	COD/SC	CHPF	UNID.	QTD/UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASÉ ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
682	ARAME RECOZIDO TORCIDO	72171000	0102	5102	KG	4,0000	19,37	1,20	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG L2 CP-IV 32 RS	25232910	0500	5406	SC	10,0000	27,49	4,25	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CAL ITAU	25221000	0500	5406	SC	10,0000	14,89	2,32	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AREIA MÉDIA (VIAGEM)	25038000	0102	5102	KG	1,0000	429,88	6,64	423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PEDRA 1 VIAGEM	25171000	0102	5102	KG	1,0000	532,47	8,24	524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	FERRO 10,00MM 3/8 CASS 12MTS	72142000	0500	5406	BR	4,0000	56,19	3,47	221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	PREGO 17 X 21	73179040	0102	5102	KG	1,0000	21,31	0,33	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	PREGO 18 X 24	73170000	0500	5406	PC	1,0000	19,00	0,29	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG L2 CP-IV 32 RS	25232910	0500	5406	SC	10,0000	27,49	4,25	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG L2 CP-IV 32 RS	25232910	0500	5406	SC	10,0000	27,71	4,28	272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	FERRO 8,00MM 5/16 CASS 12MTS	72142000	0500	5406	BR	2,0000	46,90	1,65	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG L2 CP-IV 32 RS	25232910	0500	5406	SC	15,0000	27,71	8,42	409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PEDRA 1	25171000	0102	5102	MT	2,0000	110,40	3,61	217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AREIA MÉDIA (VIAGEM)	25038000	0102	5102	KG	1,0000	429,88	6,64	423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19577	GP TUBO ESGOTO 150MM - 6 POL. (BARRA 6 MT)	39172300	0500	5406	BR	3,0000	142,72	6,62	141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO										
PEDIDO(S): 28933, 29655, 29995 DESTINATARIO/REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC DOCUMENTO EMITIDO POR MF OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib. Aprox R\$: 561,26 Fed e 679,25 Est Foste: IBPT 5o17eW Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 OBS. CLIENTE: Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019														
														

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:

PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTI FILHO

Rua Prof. Fenizio Marchini, 1030 - Flávio Zachi -
CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-5066
financeiro@depositomarchioretto.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 0000011117 fl. 2 /2
 SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3522 0230-9458 1300 0115 5500 1000 0011 1710 0014 7150

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizada

ENDEREÇO DE OPERAÇÃO:

VENDA

 INSERÇÃO ESTADUAL
 37409389510

INSCRIÇÃO FEDERAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CIF

30.945.813/0001-15

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NOME/ST	CÓDIGO	CTPF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
17442	ESTACA 2,40M D19-40 3/8 EST SMM CADA 20 - 40CM. S/EST 1 L	73084000	0509	5485	UN	3,0000	84,10	3,90	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13780	SAPATA 47X67X38 100 1/4 + PELE 50 1/4	73084000	0102	5102	UN	3,0000	119,55	5,53	352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15364	ARRANQUE 03/8 COM 1,00M - TOTAL DE 12 PEDACOS + ESTRIBO	73084000	0102	5102	PC	1,0000	80,45	1,24	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15360	COLUNA 2,50M 17X17 40 3/8 EST SMM CADA 20 (50CM S/ EST 1)	73084000	0102	5102	PC	3,0000	57,85	4,08	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15362	VIGA 3,00M 50X15-40 3/8 EST SMM CADA 15 - 30CM S/ EST 2	73084000	0102	5102	PC	1,0000	132,85	2,05	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 PROCESSO
 N° 2842710/2019

 CONFERE COM
 O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie 000000002012 - 1
Autenticidade 1XYX-0DVY
Data de Emissão 17/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:05.481.848/0001-01 IM: 32403 IE: 374114387111 Fone: (19)3863-3512
 Nome/Razão Social: LUPPI & PEDROSO LTDA,
 Endereço: RUA PROFESSOR FENIZIO MARQUINI,980 - CEP : 13971000
 Município: Itapira UF: SP E-mail: financeiro@depositornarchioretto.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:49.917.156/0001-20 IM: 51232 IE: ISENTO Fone: (19) 3813-2131
 Nome/Razão Social: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
 Endereço: RUA ALLAN KARDEC,159 - CEP : 13972186
 Município: Itapira UF: SP E-mail: claudia.boretti@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA GRANDE COM REMOÇÃO DE ENTULHO R\$ 220,00

REETENÇÃO DE ISSQN NA FONTE R\$ 8,25

VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 211,75

VENCIMENTO DIA 21/03/2022

PROCESSO
Nº 2842710/2019

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 138.186.197.75

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 39,55 - Aliq: 17,98%

Situação de Tributação

Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	220,00	3,7500%	8,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

- Instruções de Impressão**
- Imprima em Impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não recorte, rasque, fure ou dobre a régua onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81670000000 2 08252094202 8 20315888801 6 20514589001 3

Prefeitura Municipal de Itapira				Esposa R\$	Quantidade	
Número do documento		Vencimento		Valor documento		
20514589		15/03/2022				8,25
	(+) Correção	(-) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(-) Valor cobrado		
	0,00	0,00	0,00	0,00		8,25
Contribuinte						
Razão Social / Nome: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC						
IM: 51232						
CNPJ: 49917156000120						

Demonstrativo
 Ref: ISSQN do mês de competência 02 ano 2022 (Serviços Tomados)
 Vr Principal: R\$ 8,25 / Vr Correção: R\$ 0,00
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
 Vr Boleto Mínimo(Comp. Anteriores): R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81670000000 2 08252094202 8 20315888801 6 20514589001 3

Local de pagamento					Vencimento
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e Lotéricas					15/03/2022
Prefeitura Municipal de Itapira					
Data do documento	Nº documento	Esposa doc. REC	Aceite	Data processamento	
17/02/2022	20514589			17/02/2022	
Uso da taxa		Esposa R\$	Quantidade	Período	(-) Valor documento
				2/2022	8,25
Instruções (Texto de responsabilidade do cidadão)					
Ref: ISSQN do mês de competência 02 ano 2022 (Serviços Tomados) - VENCIDO, NO MÊS DE VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) VENCIDO, APÓS O MÊS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) + JUROS DE MORA DE 1% (UM P					
Vr Principal: R\$ 8,25 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 Vr Boleto Mínimo(Comp. Anteriores): R\$ 0,00					
NÃO RECEBER APÓS 31/12/2022					
PROCESSO Nº 2842710/2019					
Contribuinte					Cód. baba
Razão Social / Nome: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC					
IM: 51232					
CNPJ: 49917156000120					

Autenticação mecânica

81670000000 2 08252094202 8 20315888801 6 20514589001 3



Corte na linha pontilhada

CONFIRME COM
O ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie 000000002013 - 1
Autenticidade 1U1K-35JU
Data de Emissão 17/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.481.848/0001-01 IM: 32403 IE: 374114387111 Fone: (19)3863-3512
 Nome/Razão Social: LUPPI & PEDROSO LTDA.
 Endereço: RUA PROFESSOR FENIZIO MARQUINI,980 - CEP : 13971000
 Município: Itapira UF: SP E-mail: financeiro@depositomarchioretto.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.917.156/0001-20 IM: 51232 IE: ISENTO Fone: (19) 3813-2131
 Nome/Razão Social: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
 Endereço: RUA ALLAN KARDEC,159 - CEP : 13972185
 Município: Itapira UF: SP E-mail: claudia.boretti@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA GRANDE COM REMOÇÃO DE ENTULHO R\$200,00

REETENÇÃO DE ISSQN NA FONTE R\$8,25

VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$211,75

VENCIMENTO 21/03/2022

Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019

**PROCESSO
Nº 2842710/2019**

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 138.185.197.75

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 39,55 - Aliq: 17,98%

Situação de Tributação

Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	220,00	3,7500%	8,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, riscue, fure ou sobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL**

816000000000 9 08252094202 8 20315888801 6 20514586001 6

Prefeitura Municipal de Itapira				Especie R\$	Quantidade	
Número do documento:		Vencimento:		Valor documento		
20514586			15/03/2022			8,25
	(+) Correção:	(+) Mora / Multa:	(+) Mora / Juros:	(+) Valor cobrado		
	0,00	0,00	0,00	0,00		8,25

Contribuinte:

Razão Social / Nome: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

IM: 51232

CNPJ: 49917156000120

Descrição:

Ref: ISSQN do mês de competência 02 ano 2022 (Serviços Tomados)

Vr Principal: R\$ 8,25 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo(Comp. Anteriores): R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL**

816000000000 9 08252094202 8 20315888801 6 20514586001 6

Local de pagamento	Vencimento			
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e Lotéricas	15/03/2022			
Prefeitura Municipal de Itapira				
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceito	Data processamento
17/02/2022	20514586	REC		17/02/2022
Uso do banco		Especie R\$	Quantidade	Período
				(+) Valor documento
				8,25
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mês de competência 02 ano 2022 (Serviços Tomados)				
- VENCIDO, NO MÊS DE VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO)				
- VENCIDO, APÓS O MÊS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) +				
JUROS DE MORA DE 1% (UM P)				
Vr Principal: R\$ 8,25 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Vr Boleto Mínimo(Comp. Anteriores): R\$ 0,00				
NÃO RECEBER APÓS 31/12/2022				
PROCESSO Nº 2842710/2019				
Código de barras				
Cópia, bala				

Autenticação mecânica

816000000000 9 08252094202 8 20315888801 6 20514586001 6



Corte na linha pontilhada

JRR	Rodrigues e Rodrigues Construções e Reformas LTDA ME	
	Avenida Henrique Soares, 845 - Jardim Soares, Itapira, SP - CEP: 13976070 - Fone/Fax: 38434092	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO		CHAVE DE ACESSO 3522 0234 3248 9608 6122 6500 1006 6002 5010 8409 4009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374078070116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FIS.	CNPJ/CPF 24.324.896/0001-22
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
SOCIEDADE SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		CPF/CNPJ 49.917.156/0001-20
ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, 159 -	Bairro/Localidade JARDIM ISAURA	CEP 13972-186
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	OUTRAS DISPENSAS/ACORDOS/ES	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTAS 9 - Sem Frete	CÓDIGO ART	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MANCA	SUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ESPECIE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NF	EST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNID	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR ICMS	VALOR	VALOR ICMS
001	Laje treliçada II-3 (METRO LINEAR)	68010100	DBS	5101	MTL	311,2900	12,0000	3.735,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Bazão Social : Rodrigues e Rodrigues Construções e Reformas LTDA / CNPJ : 24.324.896/0001-22 / Banco : Santander / Agência : 0332 Conta : 13006270-5	RESERVADO AO FISCO
Chave PIX : 19988770040 Banco : Santander / Chave PIX 2 : 24324896000122 Banco : Bicob	CONFERE COM O ORIGINAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO – PROCESSO Nº 2842710/2019



Período de 01 a 28/02/2022



Foto 01 – Armação de pilar, concretagem e alvenaria de vedação – data: 02/02/2022



TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Bernardo Petres Júnior
Presidente



Foto 03 – Desmontagem de caixaria e chapisco – data: 08/02/2022



Balduino Peres Junior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0



Foto 05 – Caixaria de pilar e concretagem – data: 11/02/2022



Foto 06 – Alvenaria de vedação – data: 17/02/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CRP.J. 48.917.156/00001-20

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Betâminho Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0



Foto 07 – Alvenaria de vedação – data: 18/02/2022



Belamino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU/BA 26816-0



Foto 09 – Chapisco da parede – data: 22/02/2022



Foto 10 – Enchimento pilar de amarração – data: 22/02/2022



Foto 11 – Chapisco da parede – data: 22/02/2022



Foto 12 - Chapisco da parede – data: 23/02/2022



Foto 13 – Chapisco da parede – data: 23/02/2022



TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belamílio Penes Júnior
Presidente

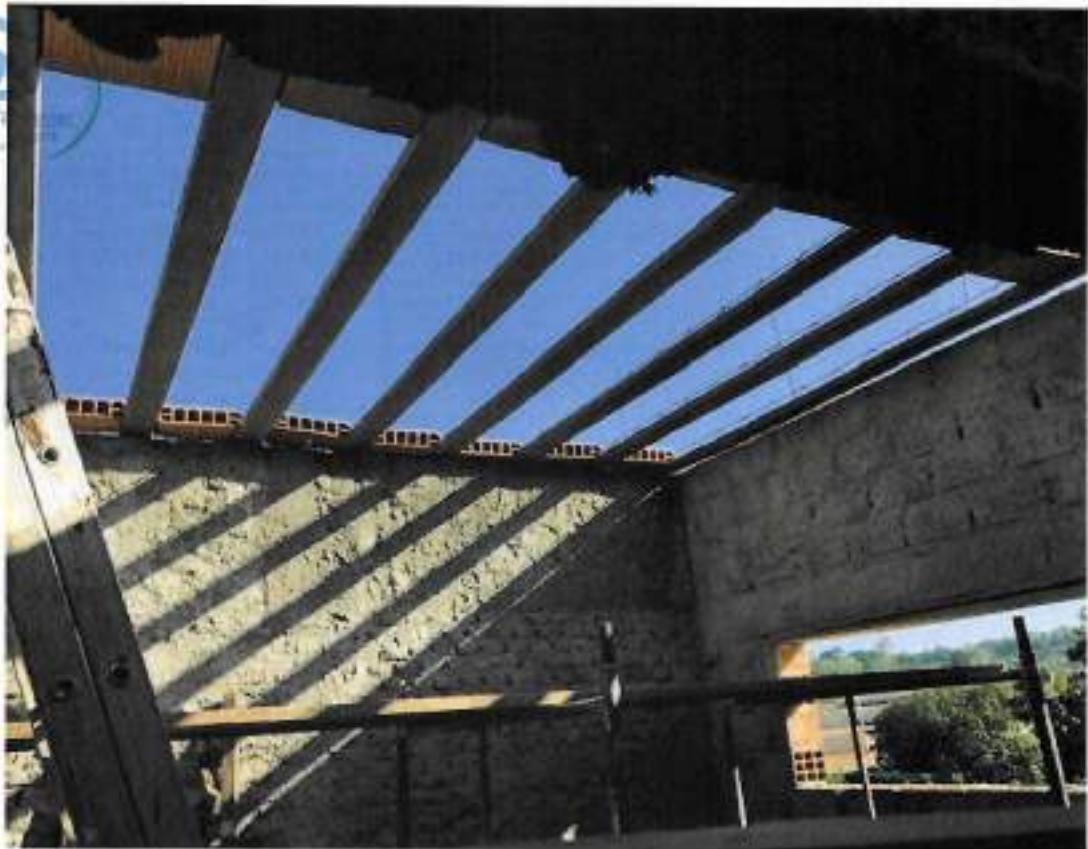


Foto 15 – Montagem da laje pré-moldada de forro – data: 24/02/2022

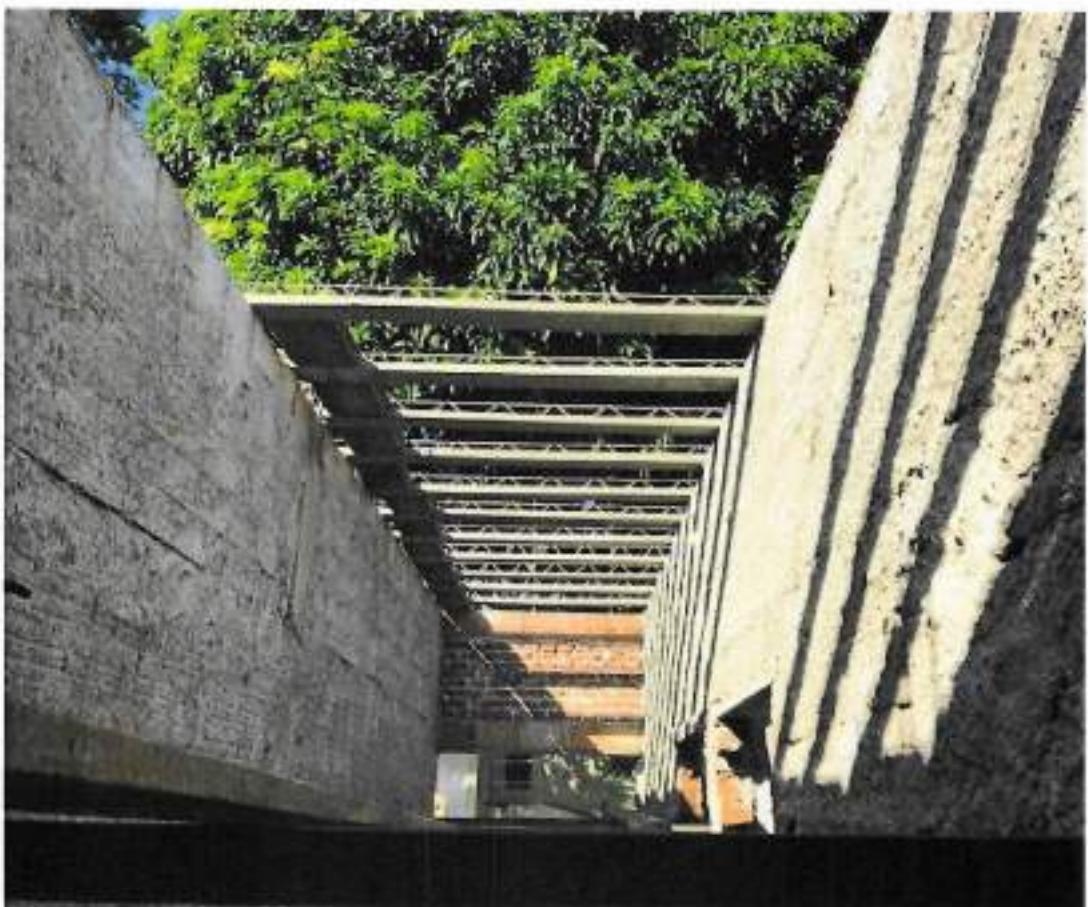


Foto 16 – Montagem da laje pré-moldada de forro – data: 25/02/2022



Foto 17 – Montagem da laje pré-moldada de forro – data: 25/02/2022



Foto 18 – Montagem da laje pré-moldada de forro – data: 25/02/2022

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente



Foto 19 – Montagem da laje pré-moldada de forro – data: 28/02/2022



Foto 20 – Montagem da laje pré-moldada de forro – data: 28/02/2022

[Handwritten signatures]

Tiago Félix
Arquiteto

Belarmino Peres Júnior
Presidente



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL

DADOS DO CONVÉNIO OU PARCERIA

Data:	28/02/2022	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC			
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE				
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISaura			
Município:	ITAPIRA	DRAOS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA			
Data de	24/06/2021	Término da vigência: 24/06/2022			
Valor do convênio:	R\$ 200.000,00	Valor total da obra:	R\$ 350.382,91	Valor da contrapartida:	R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?	Sim <input checked="" type="checkbox"/> →	Valor total da obra licitada:	R\$ 350.382,91		
		Data de início:	12/07/2021	Previsão de término:	24/06/2022
		% de execução física da obra:	37,71%	% de execução financeira da obra:	37,71%
Não	<input type="checkbox"/> →	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período:
	<input type="checkbox"/> →	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período:
Data prevista inauguração:	JULHO/2022				
Eng.Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX				
Telefone:	1193863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM		

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX	
CREA/CAU:	A26816-0	Assinatura:
ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)		

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: casarepousocallankardec@gmail.com

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Internet: www.casaderepousocallankardec.com.br

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3883-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-180 – ITAPIRA – SP.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FEV/22	
							Subtotal	R\$ 6.924,96
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	68%	R\$ 3.197,74
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m ²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	R\$ 2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	R\$ 122,40
ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
2 INFRA-ESTRUTURA								
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÓRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILÉNICO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m ²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	R\$ 5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	R\$ 2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	13,44	R\$ 254,78	R\$ 3.558,64	100%	R\$ 3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	R\$ 128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	R\$ 435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	R\$ 1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	R\$ 1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	R\$ 564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	R\$ 9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	R\$ 126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	R\$ 23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	R\$ 563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m ³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	R\$ 2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	95%	R\$ 4.132,21
2.15	99059	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	R\$ 2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	R\$ 3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	R\$ 1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	R\$ 538,04
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m ³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	R\$ 164,91

ITEM	COD. REF. MATERIAL	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	R\$	VALOR TOTAL		
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06		100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60		100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91		100%	9.798,91
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAVENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICÁ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04		100%	2.847,04
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59		95%	1.962,31
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95		95%	1.541,81
3 SUPRA ESTRUTURA					Subtotal	R\$ 44.630,36	68%	30.352,48	
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31		95%	3.827,85
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m³	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32		75%	4.359,99
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54		90%	1.398,18
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17		90%	2.542,65
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23		90%	812,01
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75		50%	461,38
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPoiADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05		60%	17.150,43
4 PAREDES E PAINÉIS					Subtotal	R\$ 35.960,49	89%	32.045,27	
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82		90%	570,44
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73		90%	18.911,45

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br
Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.I. 49.917.150/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 169 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	COD. REF. FATURADO	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	85%	3.400,48
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	90%	7.782,82
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	100%	195,64
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	100%	438,61
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	10,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	85%	431,45
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	60%	102,96
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	60%	211,42
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,82	10%	7.300,44
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93	0%	0,00
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.084,69	0%	0,00
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66	45%	7.500,44
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07	0%	0,00
5.5	94219	CUMEIRIA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32	0%	0,00
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36	0%	0,00
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65		
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43		
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41		
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60		

ITEM	CÓD. REF. ESTAD. 10	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 87X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66		
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17		
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78		
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59		
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20	2%	245,70
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	0%	0,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	15%	245,70
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00		
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00		
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50		
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00		
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50		
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80		
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94		
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72		
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60		
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un.	41,00	R\$ 8,92	R\$ 406,72		
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08		
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00		
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00		
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44		
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66		

E-mail: contato@casadearrepousocallankardec.com.br
Internet: www.casadearrepousocallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 169 - FONES (19) 3863-2267 - 3863-1577 - CEP 13072-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26616-0

ITEM	CÓD. REF. BARRA	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIF.	VALOR TOTAL		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20		
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16		
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88		
8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					Subtotal	R\$ 21.371,03	2%	350,88
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	0%	0,00
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	0%	0,00
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	0%	0,00
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	0%	0,00
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	0%	0,00
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	0%	0,00
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	0%	0,00
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	0%	0,00
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA RÉGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	0%	0,00
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	0%	0,00
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	0%	0,00
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	0%	0,00
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	0%	0,00
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	0%	0,00
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	0%	0,00
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	0%	0,00
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	0%	0,00

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: contato@casadearrepousodeallankardec.com.br
Institucional: www.casadearrepousodeallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.F./N.I. 49.917.150/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (16) 3663-2257 – 3663-1577 – CEP 13072-186 – ITAPIRA – ESTADO DE SÃO PAULO
