



Foto 02 – Impermeabilizando as paredes do baldrame – data: 02/09/2021



Foto 03 – Levantamento da parede externa de nivelamento – data:
02/09/2021



Foto 04 – Levantamento da parede externa de nivelamento – data:
03/09/2021

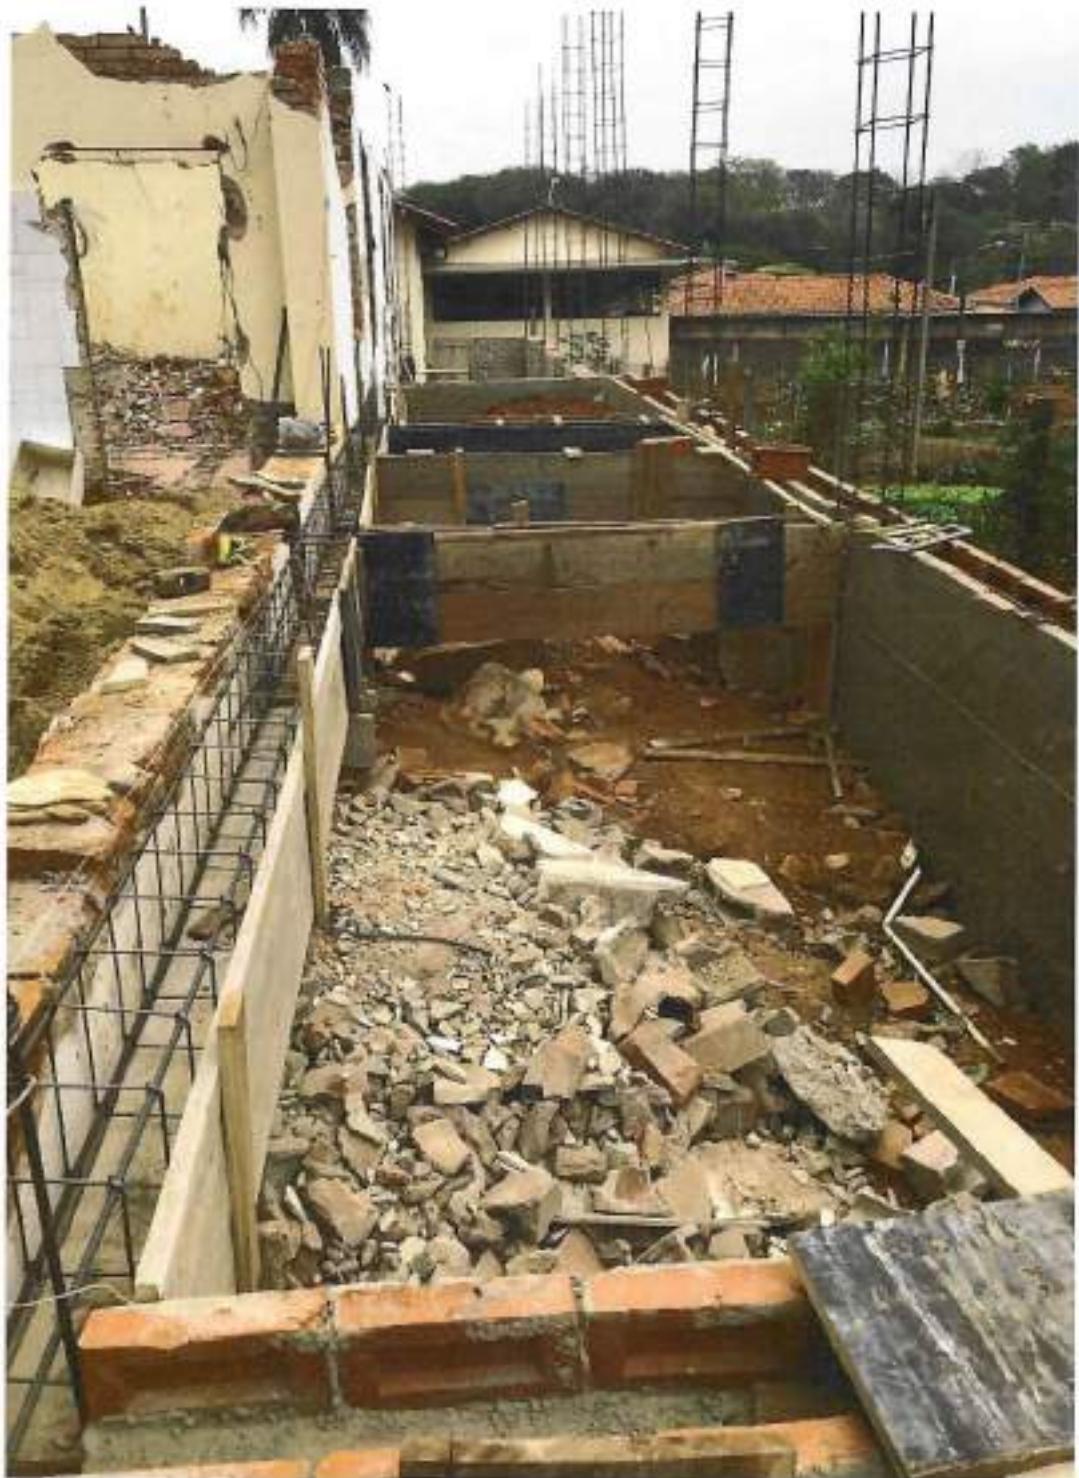


Foto 05 – Montagem e concretagem de vigas e pilares – data: 06/09/2021



Foto 06 – Chapisco interno e externo da parede externa – data:
06/09/2021

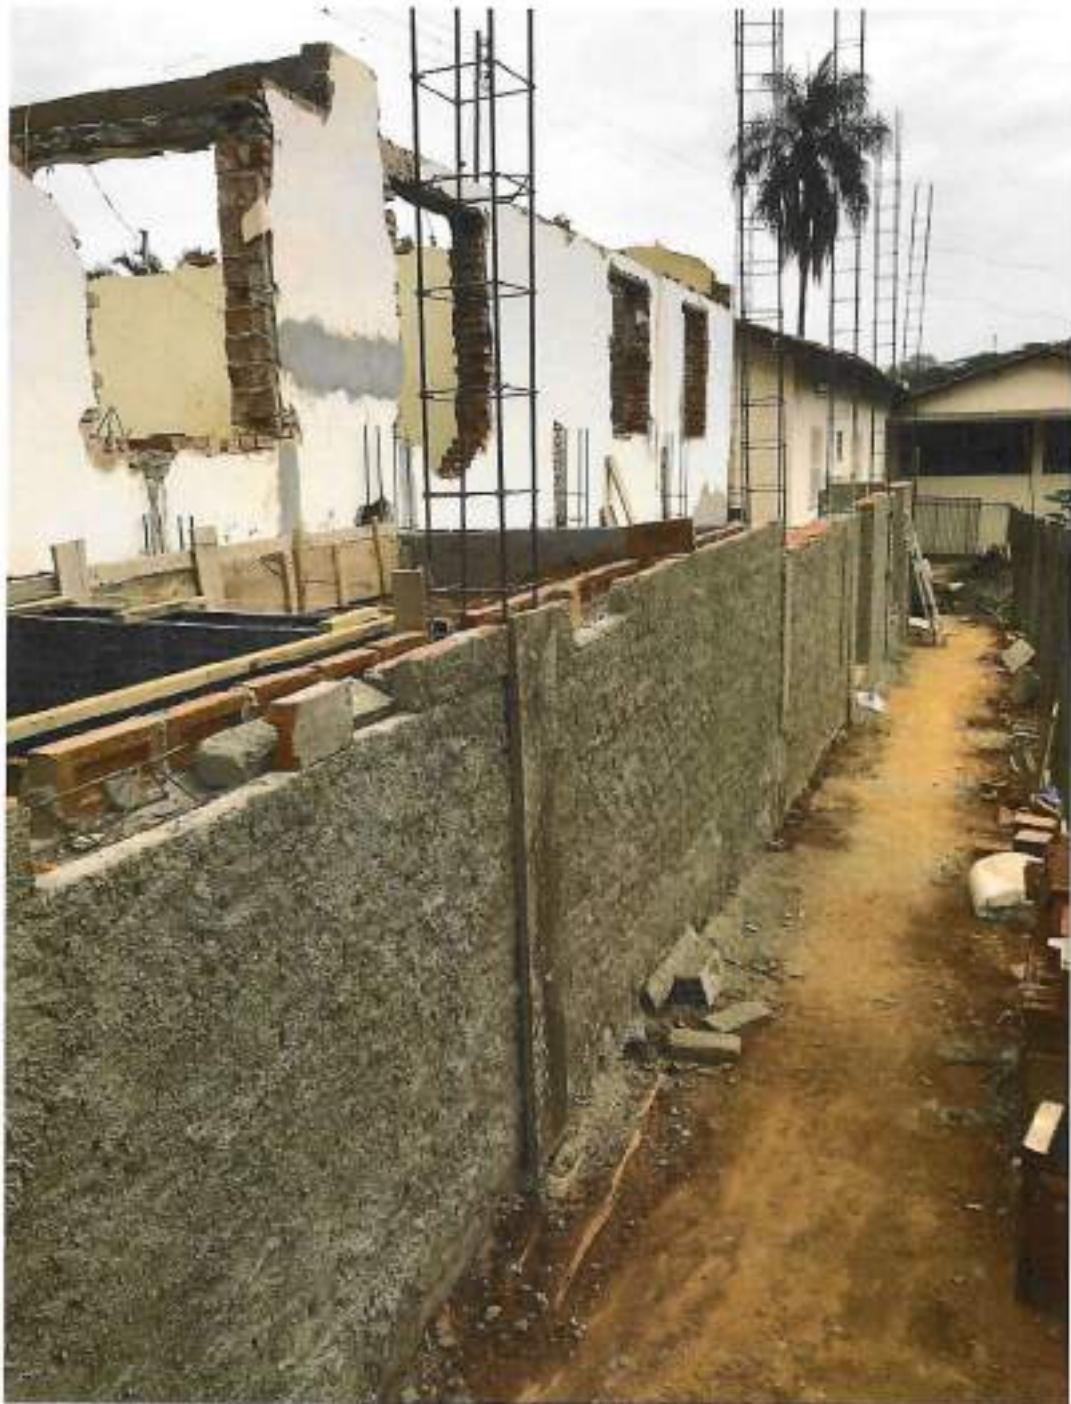


Foto 07 – Chapisco externo da parede externa lateral – data: 10/09/2021



Foto 08 – Montagem e concretagem de pilares – data: 10/09/2021

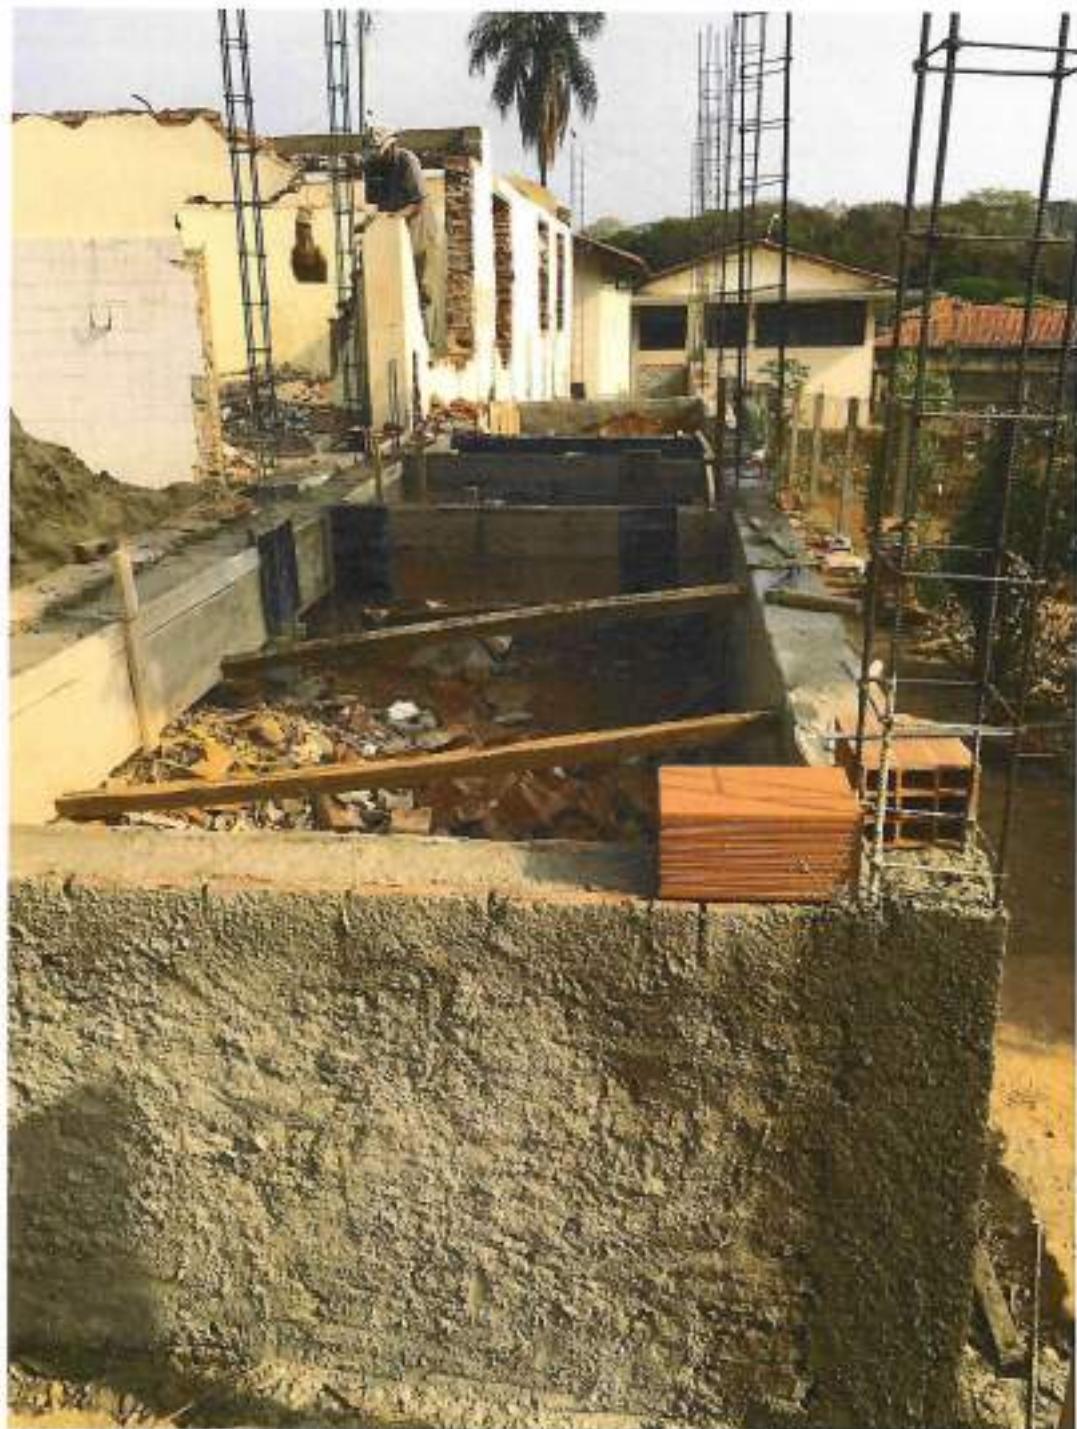


Foto 09 – concretagem de vigas e pilares – data: 10/09/2021

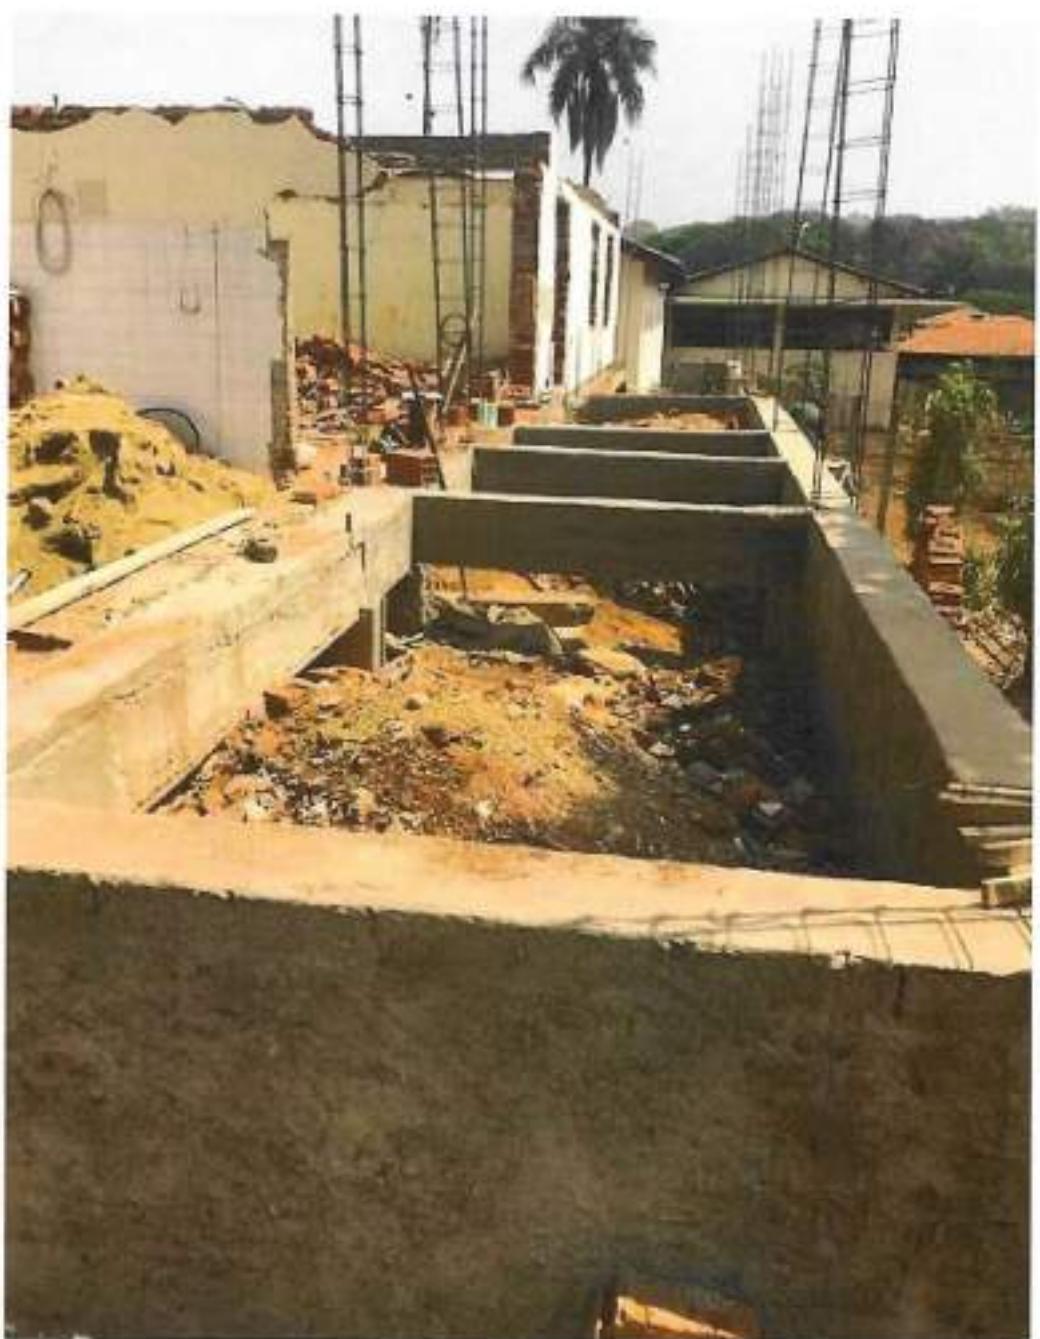


Foto 10 – desmontagem de formas de vigas e pilares – data: 14/09/2021



Foto 11 – impermeabilização de baldrame e vigas – data: 15/09/2021



Foto 12 – montagem laje de piso da área de expansão – data: 16/09/2021

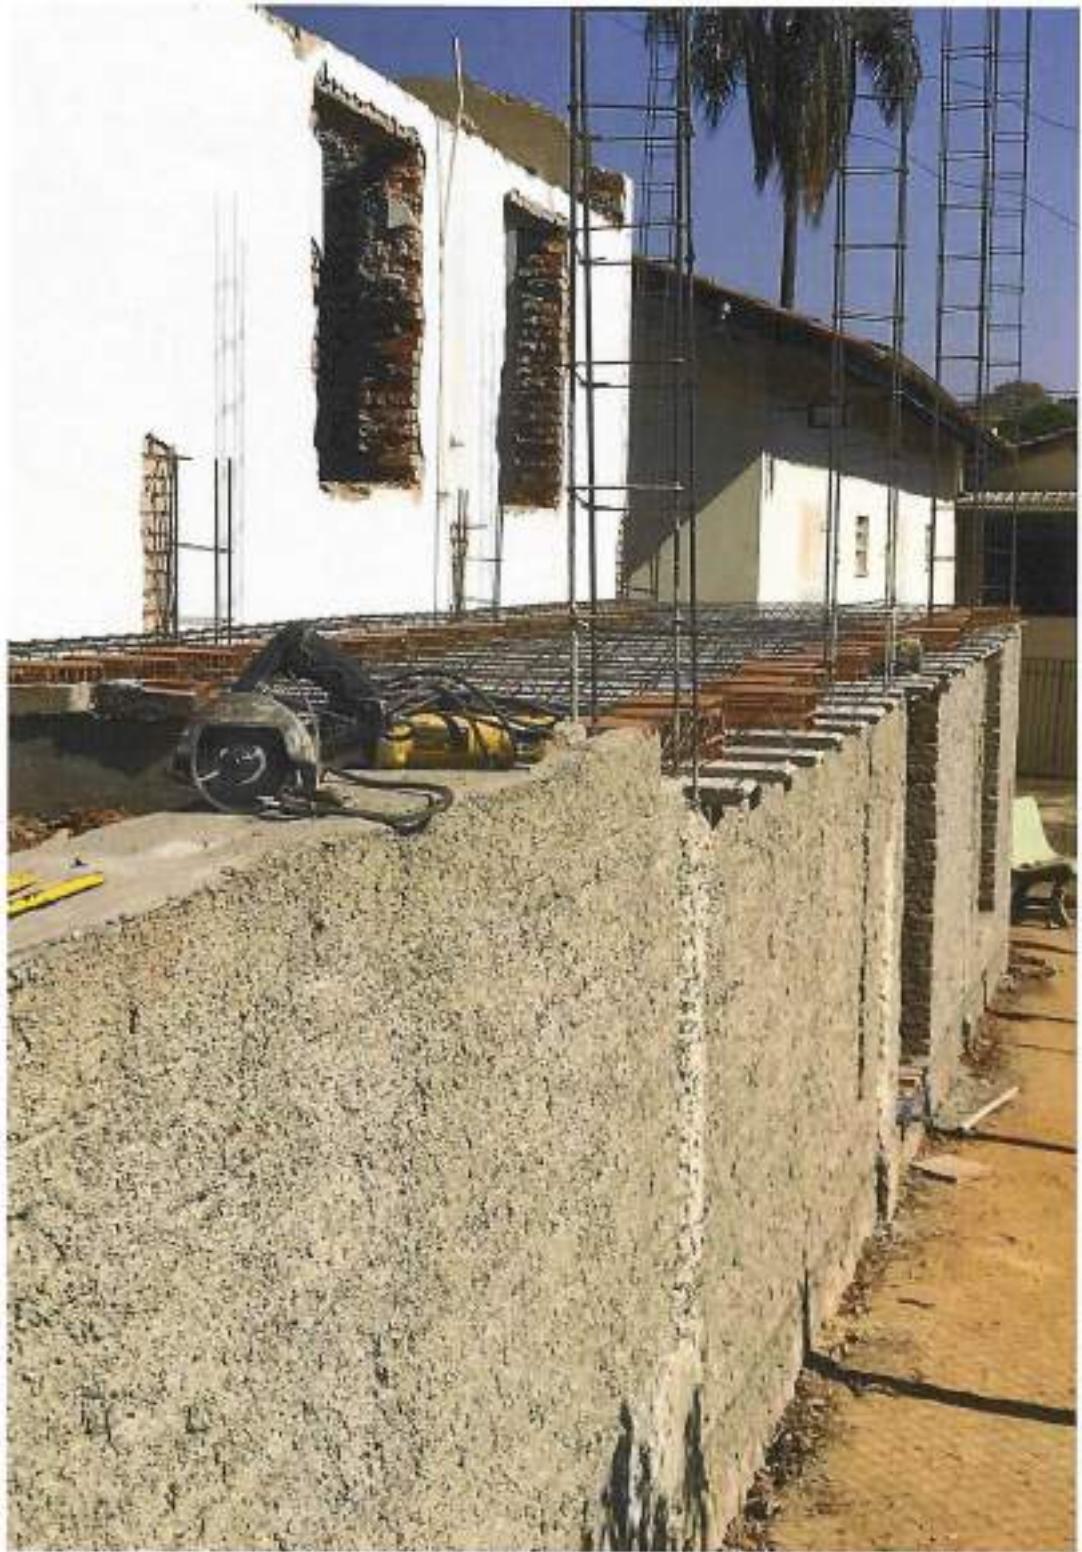


Foto 13 – Montagem dos trilhos e lajotas do piso da área de expansão –
data: 16/09/2021

✓



Foto 14 – colocação lajotas no piso da área expansão – data: 16/09/2021



Foto 15 – parte inferior piso da área de expansão – data: 16/09/2021



Foto 16 – construção do baldrame e canaletas de salas internas – data:
20/09/2021



Foto 17 – enchimento e impermeabilização baldrames – data: 22/09/2021

X



Foto 18 – preparação final tubulação esgoto e concretagem – data:
27/09/2021

61



Foto 19 – preparação final tubulação esgoto e concretagem – data:
27/09/2021



Foto 20 – levantamento alvenaria de paredes – data: 29/09/2021



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/10/2021 à 29/10/2021

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSIONAR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 834,30

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
05/10/2021	NF 2250	OBRAS-PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 848,75
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	R\$ 26,25
15/10/2021	NF 917	OBRAS-MATERIAL	R\$ 5.981,75
TOTAL			R\$ 6.836,75

Número de Documentos Relacionados: 03

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 6.836,75

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 182.200,95

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 29 de outubro de 2021.

Belarmino Peres Júnior
Presidente



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO N°: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE		
HISTÓRICO		PAGAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO		
28/06/2021		ORDEM BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00 R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00 R\$ 199.636,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00 R\$ 191.840,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ - R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ - R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ - R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ - R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ - R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ - R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ - R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20 R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60 R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.564,22	R\$ - R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ - R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG.CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ - R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 868	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ - R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ - R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ - R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ - R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00 R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80 R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15 R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84 R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 2250	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ - R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ - R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97 R\$ 187.354,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90 R\$ 187.355,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ - R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ - R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ - R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64 R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88 R\$ 181.457,49



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE			
HISTÓRICO		PAGAMENTO				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95
		SALDO FINAL			R\$ -	R\$ 182.200,95

Itapira, 29 de outubro de 2021.

W.W.
Belarmino Peres Júnior

Presidente



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec

CNPJ: 49.917.156/0001-20

ENDEREÇO E CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186

RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior

CPF: 024.881.768-00

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
julho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 188.234,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 834,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 189.069,05

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**PROTOCOLO
DRADS MOG**

Data: 23 / 12 / 2021

Hora: 13 : 00

Protocolado: 23/12/2021

Assinatura: [Signature]

E-mail: contato@casaderepousossalankardec.com.br

Internet: www.casaderepousossalankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONE/FAX (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J+ H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
OBRAS	R\$ 6.810,50		R\$ 6.810,50	R\$ 6.810,50	R\$ -
DES.FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35		R\$ 31,35	R\$ 31,35	
GUIA RECOLHIMENTO ISS	R\$ 26,25		R\$ 26,25	R\$ 26,25	

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 189.069,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 6.868,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 182.200,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 182.200,95

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 29 de outubro de 2021

Belarmino Peres Júnior

Presidente

E-mail: contato@casaderepousocellankardec.com.br

Internet: www.casaderepousocellankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Série
0000002250 - E
Autenticidade
BOLN-HOXH

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 05/10/2021 09:36:09

Competência (Serv.): 10/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 04.859.473/0003-61 IN: 25457 IE:

Fone: (19) 3814-4789

Endereço.....: JOÃO PINTO, 587 - CEP: 13803360

Município....: MOGI MIRIM UF:SP Email:nfconcreto@pavimentadorasantoxpedito.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 49.917.156/0001-20 IN: IE: ISERENTO

Fone:

Endereço.....: RUA R ALLAN KARDEC, 159 - CEP: 13972186, VILA IZABRA

Município....: ITAPIRA UF:SP

Email.....: belarmino@pegorari.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCRETO USINADO, SERVIÇO DESTINADO À OBRA: RUA ALLAN KARDEC, 159 VILA IZABRA - ITAPIRA/SP.

COMPR ENTREGA: 34919

QTDADE: 3,5 M³ FCK 25 MPa (250,00 UNIT)

OS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO ESTÃO SUJEITOS A RETENÇÃO DO IRRP E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, LEI 10.833/03 ART. 30 DA IN 459/04, PN CST 8/86.

DISPENSADA DA RETENÇÃO DO INSS, COMP. IN 971/2009 ART. 143 INC. IV

VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 848,75

VEENCIMENTO: DEPÓSITO.

PROCESSO
Nº 2842710/2019

Material Obra

Processo executado por: 177.47.255.26

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 117,68 - Aliq: 13,45%

Situação de Tributação

Não Tributada em Mogi Mirim - Retido
Tributada em Itapira-SP

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDIM (R\$)	PIS (R\$)	COPINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não impõem na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
875,00	0,00	875,00	3,0000%	26,25	848,75

*CONFERE COM
O ORIGINAL*

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou sobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81660000000 3 26252094202 6 11116888801 9 20494708001 4

Prefeitura Municipal de Itapira		Especie R\$	Quantidade	
Número do documento		Vencimento	Valor documento	
20494708		16/10/2021		26,25
	(+) Correção	(-) Mora / Multa	(-) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	26,25
Contribuinte				
Razão Social / Nome: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC				
IM: 51232				
CNPJ: 48917156000120				

Demonstrativo
Ref: ISSQM do mês de competência 10 ano 2021 Boleto Avulso Retenção
Vr Principal: R\$ 26,25 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Vr Boleto Mínimo(Comp. Anteriores): R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Referente ISS Retido: Prestador = 04859473000361 - PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO L. Nota = 2260 / Serie = e

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81660000000 3 26252094202 6 11116888801 9 20494708001 4

Local de pagamento	Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e Lotéricas				Vencimento	16/10/2021
Prefeitura Municipal de Itapira						
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acaba	Data processamento		
08/10/2021	20494708	REC		08/10/2021		
Unid de banco		Especie R\$	Quantidade	Período	(=) Valor documento	26,25
Instruções (Textos de responsabilidade do cedente):						
Ref: ISSQN do mês de competência 10 ano 2021 Boleto Avulso Retenção BANCOS/POSTOS CONVENIADOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BANCO BRADESCO - ITAÚUNIBANCO - BANCO DO BRASIL - CASAS LOTÉRICAS (VRL ATé R\$ 1.000,00) - CORRESPONDENTES BANCÁRIOS - CORREIOS. Vr Principal: R\$ 26,25 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 Vr Boleto Mínimo(Comp. Anteriores): R\$ 0,00						
PROCESSO Nº 2842710/2019						
NÃO RECEBER APÓS 31/12/2021 Referente ISS Retido: Prestador = 04859473000361 - PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO L. Nota = 2260 / Serie = e						
Contribuinte						
Razão Social / Nome: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC IM: 51232 CNPJ: 48917156000120						
Cód. Itaú						

Autenticação mecânica

81660000000 3 26252094202 6 11116888801 9 20494708001 4



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
O ORIGINAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL / SERVIÇOS / MARCHIORETTO FILHO ORIGENITOS / SERVIÇOS CONSUMIDOR DA NOTA FISCAL INICIAÇÃO AO LADO
EMISSÃO: 15/10/2021 - DEST.: BENEFÍCIO: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 5.961,75
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000917
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO RETENTOR

PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO

Rua Prof. Fenizio Marchiotti, 1030 - Flavio Zachi -
CEP 13971-000 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-5066
financeiro@depositomarchioretto.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 000000917 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO:
3521 1000 9458 1300 0115 5300 1000 0009 1710 0012 9790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/prouf
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

DESCRIÇÃO ESTADUAL

374093895110

DESCRIÇÃO ESTADUAL DO MEIR/ TIRF

CNPJ / CPF

30.945.813/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / BAIXO-SOCIAL

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ / CPF

49.917.156/0001-20

DATA DA EMISSÃO

15/10/2021

ENDEREÇO

RUA ALLAN KARDEC, 159

Bairro / Distrito

JARDIM ISAURA

CEP

13972-186

DATA SAÍDA / ENTREGA

15/10/2021

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

(19)3863-1577

UF

SP

BRASILEIRO/ESTADUAL

ITAPIRA

HORA DA SAÍDA

16:04:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ABRASCO/ROUTE

CNPJ / CPF

49.917.156/0001-20

DESCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

RUA ALLAN KARDEC, 159

MUNIC./DISTRITO

JARDIM ISAURA

CEP

13972-186

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF

SP

HORA DE PAGAMENTO/PAR

CÁLCULO DO IMPPOSTO

VALOR DO CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO IRRF	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

RADAR SOCIAL		PREÇO POR CÓDIGO	USUÁRIO ANTES	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDERECO		REMETENTE			UF	DESCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	PROVENIENCIA	PROIBIDO	PREÇO LIQUIDO
31 VOLUMES						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DETALHO DO PRODUTO/SERVIÇO	DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID/SH	UNID/F	UNID/C	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST
10	COLUNA 2,75M 20X20 40 3/8 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	3,0000	115,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15382	VIGA 11,20M 20X20 40 3/8 EST 5MM CADA 15	73084000	0102	5102	PC	1,0000	595,50	0,00	595,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15382	VIGA 10,00M 20X20 40 3/8 EST 5MM CADA 15	73084000	0102	5102	PC	1,0000	575,25	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15382	VIGA 2,60M 15X20 40 3/8 EST 5MM CADA 15	73084000	0102	5102	PC	5,0000	130,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15380	COLUNA 3,70M 10X20 40 3/8 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	2,0000	138,50	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15380	COLUNA 0,70M 10X20 40 3/8 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15380	COLUNA 3,20M 10X20 40 3/8 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	2,0000	116,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15380	COLUNA 3,20M 20X20 40 3/8 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	TRELISA H-8 (CDC)	73084000	0102	5102	MT	24,0000	9,18	0,00	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10081	CIMENTO 50KG TUPICPI H-8-32	28232919	0500	5405	SC	1,0000	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00
380	TRELISA H-8 (CDC)	73084000	0102	5102	MT	28,0000	9,18	0,00	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 17707, 18960, 19143 DESTINATARIO/REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIRETOS A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib Aprox R\$: 810, 18 Fed e 827, 31 Est Fone: IBPT SoiteW Nota Fiscal paga com recuse da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 OBS. CLIENTE: Nota Fiscal paga com recuse da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019

RESERVADO AO FISCO

Material

*CONFERE COM
O ORIGINAL*

SENTEPOGA INIDENTE:
PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO
Rua Prof. Fenizio Marchini, 1030 - Flávio Zachi -
CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-5066
finaceiro@depositomarchioretto.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000917 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO:

3521 1030 9458 1300 0115 5500 1000 0009 1710 0012 9790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUST - TRIB.

374093895110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE 150

135211214573391 15/10/2021 16:04:45

30.945.813/0001-15

CONTINUAÇÃO DOS BÁSOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ITEM / UN	QTDIN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE C/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	0500	5405	SC	15,0000	27,29	0,00	409,35	0,00	0,00	0,00	0,00
718	OTTO VEDACIT 16LTB	38244000	0102	5102	BD	1,0000	114,90	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	MACTRASET CINZA CX. 18KG	32149000	0500	5405	CX	1,0000	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	PREGO 18 X 24	73170000	0500	5405	PC	2,0000	17,69	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00
866	PREGO 17 X 21	73170000	0102	5102	KG	2,0000	21,91	0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PEDRA 1	25171000	0102	5102	MT	2,0000	104,49	0,00	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	0500	5405	SC	15,0000	27,29	0,00	409,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	MAJESTIC TUBO ESGOTO 100MM	39172300	0500	5405	MT	18,0000	14,88	0,00	263,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3770	KRONA JOELHO 90 ESGOTO 100MM - 4 POL.	39174090	0102	5102	UN	5,0000	7,08	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4469	KRONA TE ESGOTO 100MM	39174060	0500	5405	UN	5,0000	14,05	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7783	KRONA LIMA SIMPLES ESGOTO 100MM - 4 POL.	39174080	0500	5405	UN	5,0000	8,83	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TIGRE ADERIVO FRASCO 880 GR.	38061060	0500	5405	UN	1,0000	60,07	0,00	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00
,3	MAJESTIC TUBO ESGOTO 40MM	39172300	0500	5405	MT	5,0000	7,74	0,00	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	KRONA JOELHO 90 ESGOTO 40MM - 1 1/2 POL.	39174080	0500	5405	UN	5,0000	2,78	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	MACTRASET CINZA CX. 18KG	32149000	0500	5405	CX	1,0000	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17058	MALHA POP ED-48 LEVE 20X20 3,4MM 2X3 (CDC)	73142000	0500	5405	UN	4,0000	74,95	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13176	ADTEX CORRUGADO AMARELO 3/4	84749000	0500	5405	MT	50,0000	1,58	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	TIGRE CX FORCA 4 X 2	39174080	0500	5405	UN	3,0000	2,57	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00
882	ARAMI RECORRIDO TORCIDO	72175090	0102	5102	KG	4,0000	19,99	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	0500	5405	SC	10,0000	27,29	0,00	272,90	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

*Materiais
O Dr.*

CONFERE COM
O ORIGINAL

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO –
PROCESSO Nº 2842710/2019**

Período de 01 a 31/10/2021



Foto 01 – Concretagem laje de piso da área de expansão – data: 05/10/2021



Foto 02 – Concretagem laje de piso da área de expansão – data: 05/10/2021



Foto 03 – Concretagem laje de piso da área de expansão – data: 05/10/2021



Foto 04 – Concretagem laje de piso da área de expansão – data: 05/10/2021



Foto 05 – Aterro manual da área de expansão – data: 07/10/2021



Foto 06 – Aterro manual da área de expansão – data: 07/10/2021



Foto 07 – Armação de blocos – data: 11/10/2021



Foto 08 – Armação de blocos – data: 11/10/2021

6 X



Foto 09 – Alvenaria de vedação – data: 14/10/2021



Foto 10 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 14/10/2021



Foto 11 – Alvenaria de vedação – data: 21/10/2021



Foto 12 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 22/10/2021



Foto 13 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 25/10/2021

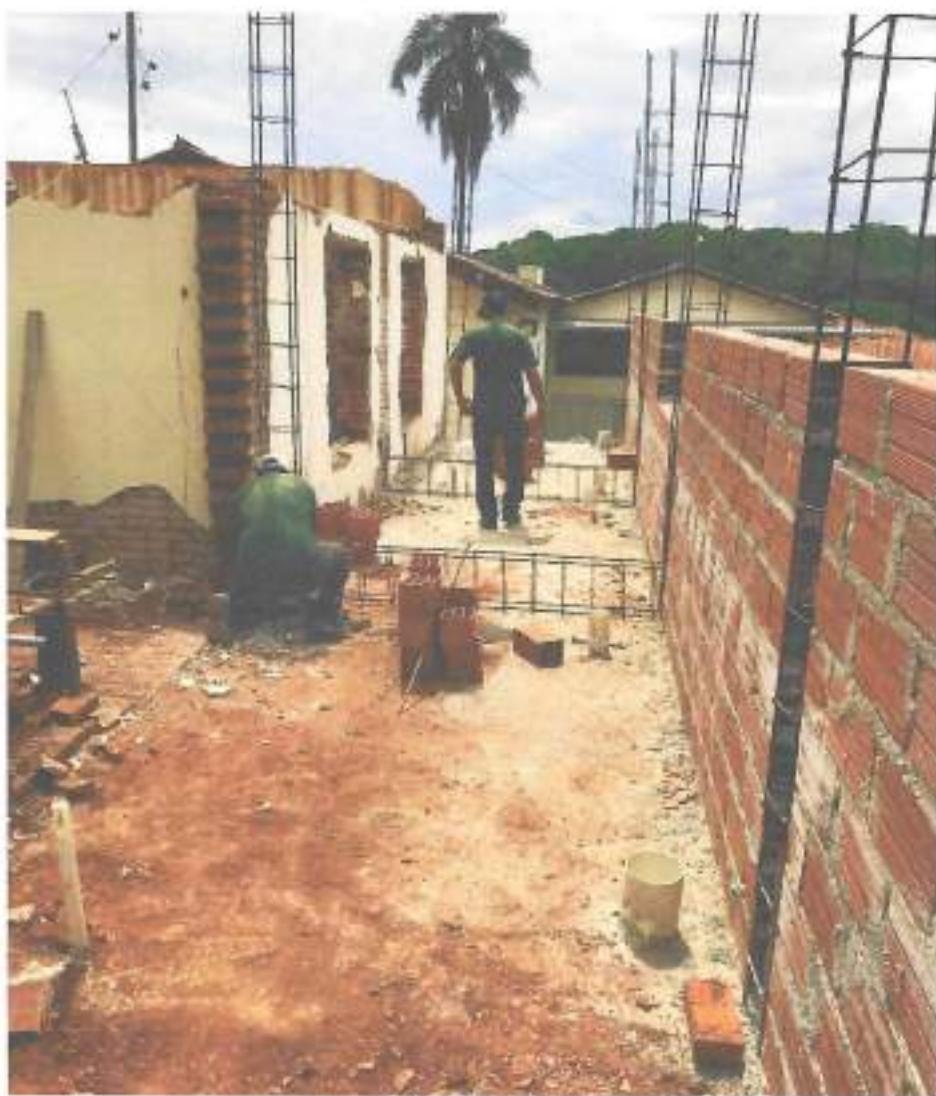


Foto 14 – Armação de viga – data: 25/10/2021

6.



Foto 15 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 27/10/2021



Foto 16 – Alvenaria de vedação – data: 27/10/2021

[Handwritten signature]



Foto 17 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 29/10/2021

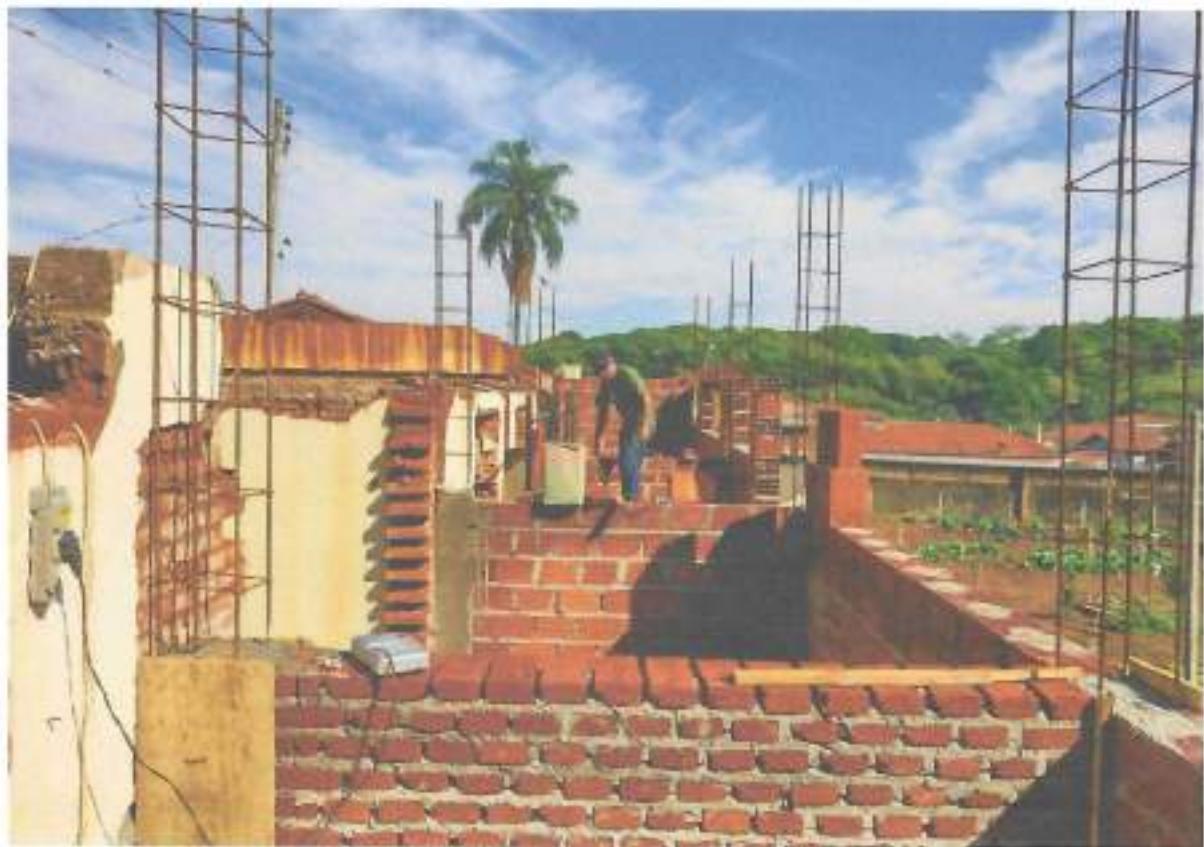


Foto 18 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 29/10/2021

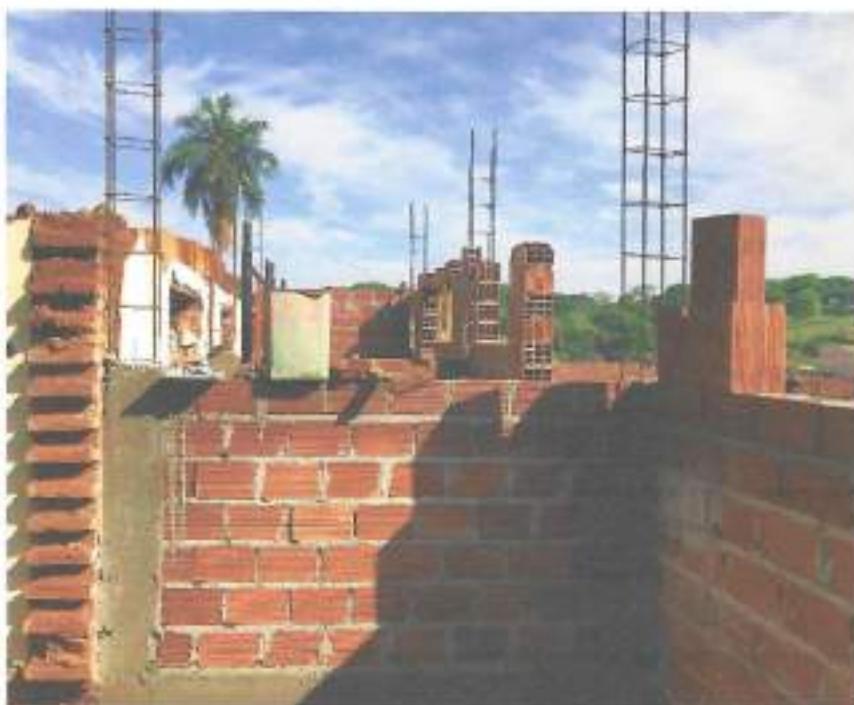


Foto 19 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 29/10/2021



Foto 20 – Alvenaria de vedação – data: 29/10/2021

~~Tiago Félix~~

Arquiteto

~~Betarmino Peres Júnior~~

Presidente



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa do Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

OUT/21

ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REALIZADO	
								R\$ 55.124,80
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				Subtotal	R\$ 6.924,96	55% 3.789,76
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	33%	1.567,36
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, M2 200,00 DE 2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2		INFRA ESTRUTURA				Subtotal	R\$ 49.367,12	86% 42.526,54
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACÍO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m²	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m² x km	1050,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	50%	2.174,85
2.15	99059	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04



ITEM	COD. NOR. PISCO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91
2.20	96574	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	80%	844,48
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	80%	7.839,13
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICÁ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	80%	2.277,63
2.24	101366	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	50%	1.032,80
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	45%	730,33
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	14%	6.096,56
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,33	25%	1.007,33
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m³	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	25%	1.453,33
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	40%	621,41
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	40%	1.130,07
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	30%	270,67
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	20%	184,55
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENTIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	5%	1.429,20
4		PAREDES E PAINÉS			Subtotal	R\$ 35.960,49	7%	2.517,05
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM [ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO] DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	25%	158,46



ITEM	COD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	5%	1.050,64
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	23,07	R\$ 173,43	R\$ 4.000,57	5%	200,03
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	10%	864,76
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	0%	0,00
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	0%	0,00
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	0%	0,00
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	20%	34,32
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	15%	52,85
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,02		
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93		
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69		
5.3	94443	TÉLHAMAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66		
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07		
5.5	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32		
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36		
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65		
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43		

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
CPN 41-4817-160001-20
RUA ALLAN KARDEC, 200 - FONTEIRAS - 25050-200 - BAHIA - CEP: 45820-100 - ITAPINA - ESTADO: BA

ITEM	CÓD. REF. PROD.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	3,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVO VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, EXCLUSIVO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94
7.10	93939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,	...	41 m	...	416,72

Obs.: os preços acima mencionados são considerados para fornecimento e instalação.

ITEM	COD. REF. PRECO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08		
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00		
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00		
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	43,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44		
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20		
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16		
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88		
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.371,03	2%	R\$ 450,88
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	0%	0,00
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	0%	0,00
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	0%	0,00
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	0%	0,00
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	0%	0,00
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	0%	0,00
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	0%	0,00
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	0%	0,00
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	0%	0,00
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	0%	0,00
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	0%	0,00
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	0%	0,00



ITEM	CÓD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64		0% 0,00
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	0%	0,00
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	0%	0,00
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88		0% 0,00
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20		0% 0,00
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00		0% 0,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	0%	0,00
8.20	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00		0% 0,00
8.21	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68		0% 0,00
8.22	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	5%	275,60
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40		0% 0,00
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82		0% 0,00
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68		0% 0,00
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90		20% 36,78
8.27	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50		20% 38,50
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34		0% 0,00
8.29	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80		0% 0,00
8.30	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICais DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50		0% 0,00
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE FNI ADMINISTRAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62		0% 0,00

E-mail: contabilidade@casadeponoros.com.br | Celular: +55 11 98188-2016 | WhatsApp: +55 11 98188-2016 | CEP: 13072-100 | ICP-SP: 03



ITEM	COD. REF. PRCO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	0%	0,00
9		PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO			Subtotal	R\$ 537,96		
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46		
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46		
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04		
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83		
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59		
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 25,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO-TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	2,00	R\$ 395,89	R\$ 791,78		
10.4	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00		
10.5	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM Furo frontal com louça branca sem assento, inclusão CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02		
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76		
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m ²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38		
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27		
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59		
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53		
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00		
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA [COM PRESENÇA DE VÃOS] E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00		

E-mail: contabilidade@casadereposoallankardec.com.br
Assunto: Conta de fornecedores e outras contas

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.F.: 24.199.517/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 198 – FONTE DA PRATA – 39560-1507 – CEP: 33872-100 – ITAPIBA – ESTADO DE
SANTA CATARINA



ITEM	COD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m ²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m ²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERfil METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERfil) EXECUTADO EM OBRA [02 DEMÃOS]. AF_01/2020	m ²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m ²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_06/2014	m ²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 3.824,74
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m ²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m ²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07
					TOTAL	R\$ 350.382,91

Autor do Projeto/Responsável:
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente da entidade



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL
DADOS DO CONVÉNIO OU PARCERIA

Data: 31/10/2021 CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE
Endereço: RUA ALLAN KARDEC, 159 Bairro: VILA ISaura
Município: ITAPIRA DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de 24/06/2021 Término da vigência: 24/06/2022

Valor de convênio: Valor total da obra: Valor da contrapartida:
R\$ 200.000,00 R\$ 350.382,91 R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?

Sim →

Valor total da obra licitada: R\$ 350.382,91

Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 24/06/2022

% de execução física da obra: 15,73% % de execução financeira da obra: 15,73%

Não →

Em Licitação? Sim Não Período: _____

→

Paralisada? Sim Não Período: _____

Data prevista inauguração: JULHO/2022

Eng.Arqj responsável pela obra: TIAGO FELIX

Telefone: (19)3863-1577

e-mail:

CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por: *TIAGO FELIX*

CREA/CAU: A26816-0

Assinatura:

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

E-mail: casarepousoallankardec@gmail.com

Site: www.casarepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.F.N.U 49.817.105/2001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - PONTE (19) 3863-2257 - CEL: (19) 98872-1982 - ITAPIRA - SP



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 1.006,13

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
08/11/2021	NF 21392	OBRAS-MATERIAL	R\$ 913,50
16/11/2021	NF 999	OBRAS-MATERIAL	R\$ 1.765,86
TOTAL			R\$ 2.679,36

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.679,36

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 180.527,72

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 30 de novembro de 2021.

Belaírmino Peres Júnior
Presidente



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO N°: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE			
HISTÓRICO		PAGAMENTO				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEM BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.564,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG E RODRIG.CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 866	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,60	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949536	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 187.365,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE			
HISTÓRICO		PAGAMENTO				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	560171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
		SALDO FINAL			R\$ -	R\$ 180.527,72

Itapira, 30 de novembro de 2021.


Belarmino Peres Junior
Presidente



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec

CNPJ: 49.917.156/0001-20

ENDEREÇO E CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186

RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior

CPF: 024.881.768-00

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
julho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 182.200,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.006,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 183.207,08

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**PROTOCOLO
DRABS MCG**

Ano: 2021

Hora: 12:00

Protocolo n° 50-223-123

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br

Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONE9 (19) 3883-2257 – 3883-1577 – CEP 13972-188 – ITAPIRA – SP




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	
OBRAS	R\$ 2.679,36		R\$ 2.679,36	R\$ 2.679,36	R\$ -	

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 183.207,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)		R\$ 2.679,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 180.527,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 180.527,72

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 30 de novembro de 2021


Belarmino Peres Júnior
Presidente

CERAMICA CANELLA LTDA

RDQ ITAPIRA/JACUTINGA, S/N KM
166,5 - MACUMBE - CEP:13972-012
- Itapira - SP
TEL: - FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000021392 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CÓDIGO DE ACESSO

35211148620694000196550010000213921381685300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

133211299788224 03/11/2021 16:05:44

CNPJ/CNP

48.620.694/0001-96

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RENAVAM

374012255114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RENAVAM

CNPJ/CNP

48.620.694/0001-96

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

ENDERECO

Rua Allan Kardec, 159

MUNICÍPIO

Itapira

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Isaura

CEP

13972-180

DATA DA FABRICAÇÃO

03/11/2021

DATA DE VALIDADE

13/11/2021

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/11/2021	913,50						

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
913,50	121,50	0,00	0,00	1.015,00	
VALIDADO PRETE	VALIDADO SEGURO	DIFERENÇA	OUTRAS DESP. ACRES	VALIDADO IMP.	VALIDO TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	913,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO	PREÇO POR CONTA	ENDEREÇO ANTES	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CERAMICA CANELLA LTDA		0 - REMETENTE				48.620.694/0001-96
ROD ITAPIRA/JACUTINGA, S/N			MUNICÍPIO Itapira		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 374012255114
QUANTIDADE:	EXPRESSO	MEIO/PA	SENIERGIA	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
1				2.054,500		2.054,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / NÚ.	CFP	CHP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ISS	VALOR OUTROS
113019	CANAleta U-15 X 19 X 29	69041000	000	5101	PC	360,00	2,90	1.015,00	101,50	313,50	92,50	0,00	13,30	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

Material

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

16/11/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL



RECEBIMENTO DE PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO - 20.988.813/0001-15 OS FABRICANTES / SERVIÇOS CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL (MERCADO AO LADO)
EMISSÃO: 16/11/2021 - DEST.: REM.: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 1.765,86

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000999
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE:

PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO

Rua Prof. Fenizio Marchini, 1930 - Flávio Zuchi -
CEP: 13971-000 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-5066
financeiro@depositomarchiorotto.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000000999 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO:
3521113094581300011535001000000999100134629

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/painel
ou no site da Sefaz Autorizadora

MATERIAL DE CARRAGEM

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13409389510

INSCRIÇÃO NACIONAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPP

30.945.813/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ/CPP

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO:

RUA ALLAN KARDEC, 159

49.917.156/0001-20

16/11/2021

MUNICÍPIO:

ITAPIRA

SACARÁ/PORTO BORNEU

CEP

DATA MÉDIA ENTREGA

FONE/FAX:

(19)3863-1577

UF:

SP

08/11/2021

PROTEÇÃO FISCAL:

OUTRAS CÓPIAS ACIMA:

VALOR DO IPI:

VALOR TOTAL DA NOTA

1.765,86

0,00

0,00

0,00

0,00

1.765,86

VALOR DO FRETE:

0,00

0,00

0,00

0,00

1.765,86

VALOR DO SEGURO:

0,00

0,00

0,00

1.765,86

DESCONTO:

0,00

0,00

0,00

1.765,86

TRANSPORTADORES / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

O MESMO

PREÇO POR UNIDADE:

0 - REMETENTE

COMBUSTÍVEL:

0,00

UF:

SP

CNPJ/CPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE:

7

VOLUME:

UNIDADE:

UNIDADE:

PERÍODO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ITEM/DETALHE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID./MI	COD. CNT	CRFB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	VALOR CALC. ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPVA	VALOR ALIAS/IR
7475	CIMENTO 50KG UZ CP-IV 32 RS	25232910	0500	5405	SC	10.0000	27,29	0,00	272,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAL ITAU	25221000	0500	5405	SC	30.0000	14,48	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AREIA MÉDIA (MAGEM)	25220000	0102	5102	M3	1.0000	429,88	0,00	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00
660	TRELICA H-B (CDC)	73084000	0102	5102	MT	24.0000	9,22	0,00	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG UZ CP-IV 32 RS	25232910	0500	5405	SC	10.0000	27,29	0,00	272,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CAL ITAU	25221000	0500	5405	SC	10.0000	14,48	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
698	FERRO 6.30MM 1H C450 12MTS	72142000	0500	5406	BR	4.0000	33,55	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

materias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC DOCUMENTO: EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib Aprix R\$: 213, 39 Fed e 234, 83 Est Fone: IBPT 5017eW Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 OBS. CLIENTE: Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL
